



ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENREGIA ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DE CALKINI Y BECAL"

Localidad de Calkiní y Becal.

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI, UBICADA EN LA CALLE 23 S/N ENTRE 18 Y 20, COLONIA SAN MIGUEL KUKAB, EN LA LOCALIDAD DE CALKINÍ, MUNICIPIO DE CALKINÍ, CAMPECHE, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, ARQ. PASTOR RAMIRO RODRIGUEZ CUEVAS Y EL RESIDENTE DE OBRA, PROFR. JOSE RAYMUNDO CAN PUC, Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA MARIANA PERLA PEREZ RAMIREZ, REPRESENTADO POR LA C. MARIANA PERLA PEREZ RAMIREZ; EL SUPERINTENDENTE DE OBRA LA C. ING. FRANCISCO GERARDO LLADO ZETINA; SE RECIBE FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE CALKINI Y BECAL, MUNICIPIO DE CALKINÍ, ESTADO DE CAMPECHE; EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS MEDIANTE OFICIO NUMERO: FISM 2015.-333MAPR001019 Y 333MAPR001020 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2015, PROGRAMA: SG.-ELECTRIFICACION Y SUBPROGRAMA:01.-URBANA. Y CON NUMERO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: HAC-DOP-FISM-06/2015.

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA FUERON PACTADOS EN EL CONTRATO ANTES MENCIONADO INICIANDO EL 28 DE FEBRERO DEL 2015 Y TERMINANDO EL 14 DE MAYO DE 2015, ES DECIR EN UN PLAZO DE 76 DÍAS NATURALES, EL MONTO CONTRATADO DE \$1, 600,327.78 SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN: \$ 1, 600,327.78 (SON: UN MILLON SEISCIENTOS MIL, TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 78/100 MONEDA NACIONAL) AMBOS CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA

PRELIMINARES


- SUMINISTRO Y FORJADO DE BASE METALICA TUBULAR PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO (1 PZA)
- TRAZO Y LOCALIZACION DE CEPAS,, ABRIR BRECHIA, Y PODA DE ARBUSTOS

POSTES DE CONCRETO

- SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750

Calle 23 (entre 18 y 20) col. Kukab
Calkini, Campeche Mx C.P 24903
Obras@Calkini.gob.mx

www.calkini.gob.mx

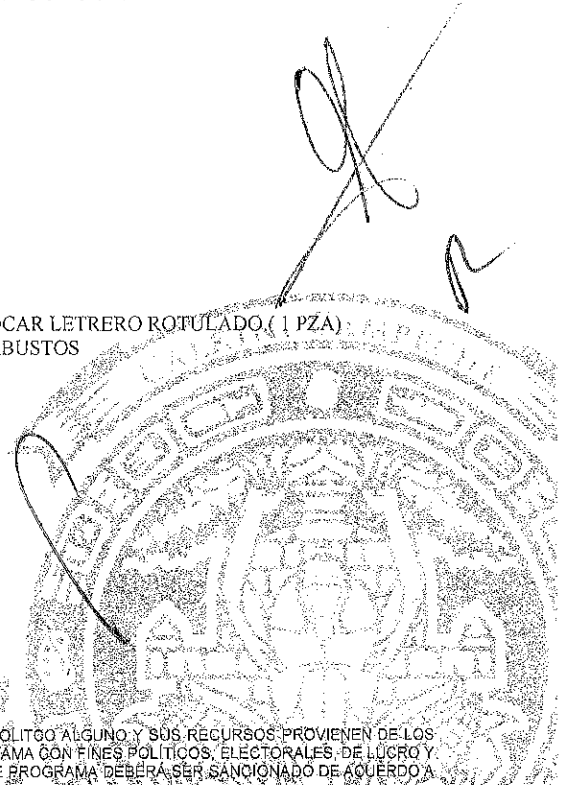



DISPOSITIVOS DE MEDIA TENSION

- SUMINISTRO Y COLOCACION TIPO TS30
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO RD20/1TR2B, AISLADOR 13 PD DISPOSITIVOS PARA BANCO DE 10 A 100 KVA A 13.2 KV CON CCF 27 KVA CON CORTACIRCUITO.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITO CCF
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO T20
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO AD20/CCF

DISPOSITIVOS DE BAJA TENSION.

- SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVOS TIPO 1R3
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO 1R3/1R3
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO 1R371R3/1R3 /1R3
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO 1P3

TRANSFORMADORES.

- SUMINISTRO, MANIOBRA Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA DE DOS BOQUILLAS 132000/220-127.(2 PZA)

CONDUCTORES.

- SUMINISTRO, TENDIDO, TENSIONADO Y CONEXIÓN DE LINEA DE MEDIA TENSION EN 2F-2H CON CABLE SEMIAISLADO ACSR 3/0 (312 ML)
- SUMINISTRO, TENDIDO, TENSIONADO Y CONEXIÓN DE LINEA DE BAJA TENSION DE NEUTRANEL (2+1) AAC 3/0-1/0(3/0 PARA FASE Y 1/0 PARA NEUTRO)

RETENIDA ELECTRICA.

- SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RSA.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA REA
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RBA

TIERRA FISICA.

- SUMINISTRO E INSTALACION DE DE SISTEMA DE TIERRA FISICA "K", INATALACION DE BAJANTE A TIERRA CON CABLE Cu-4AWGR
- SUMINISTRO E INSTALACION DE DE SISTEMA DE TIERRA FISICA "2K", INATALACION DE BAJANTE A TIERRA CON CABLE Cu-4AWGR

LUMINARIAS:

- SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA OV-15 CON BASE TIPO E39 CON UNA POTENCIA MAXIMA DE 150 W, GRADO IP65 A BASE DE MATERIAL DE ALUMINIO, CON BALASTRO EN V/S DE 150 W Y BRAZO DE LUMINARIA

COMPLEMENTARIOS.

- TRAMITE ANTE C.F.E. NECESARIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ENMTREGANDO LA DCUMENTACION.
- PAGO DE RESOLUTIVO PARA INTERCONEXION ANTE C.F.E.

ACOMETIDAS:

FORJADO DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA SERVICIO MONOFASICO CON MUTA (BASE DE MEDIDOR, CENTRO DE CARGO, PASSTILLA TERMOMAGNETICA VARILLA E TIERRA, CONECTOR, CABLE No 8 Y MURETE PREFABRICADO DE 6 PZAS)

Calle 23 (entre 18 y 20) col. Kukab
Calkini, Campeche Mx C.P 24903
Obras@Calkini.gob.mx

www.calkini.gob.mx

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES DE CÚRUL Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE"





LOS PAGOS A LA EMPRESA CONTRATISTA SE REALIZARON DE LA SIGUIENTE MANERA:

	PERÍODO	IMPORTE ESTIMADO*	IMPORTE PAGADO**	FECHA DE CHEQUE
Anticipo	-----	-----	\$480,098.04	
Uno	28 de febrero al 30 de abril de 2015	\$1021,566.71	\$812,145.54	
Dos (finiquito)	01 de mayo al 14 de mayo del 2015	\$ 358,025.34	\$ 284,630.15	
		\$1,379,592.05	\$1,576,873.73	

*los importes no incluyen I.V.A

**En el importe pagado ya se realizaron las deducciones de Ley.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DA POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASI COMO LA RELACION DE CONTRATACION ENTRE AMBAS PARTES.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL MISMO DIA DE INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.


H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ

PROFR. JOSÉ RAYMUNDO CAN PUC
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

ING. FRANCISCO GERARDO LLADO ZETINA.
SUPERINTENDENTE DE LA OBRA

ARQ. PASTOR R. RODRIGUES CUEVAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

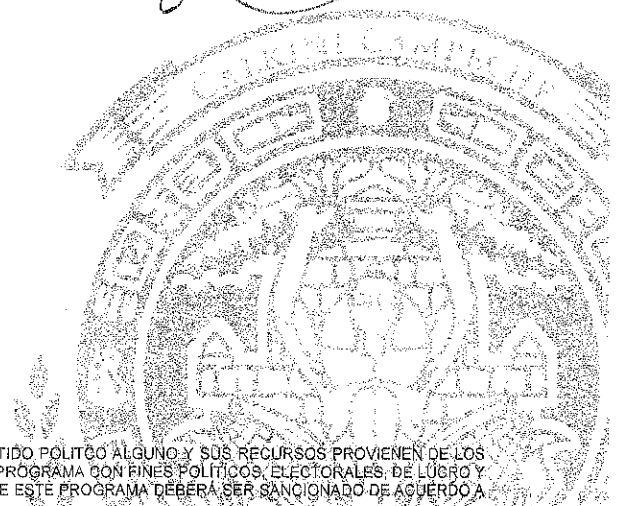

ACTA DE ENTREGA DE FINIQUITO DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENREGIA ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DE CALKINI Y BECAL"

Localidad de Calkiní y Becal.

LA PRESENTE ACTA SE LEVANTA EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI, UBICADA EN LA CALLE 23 S/N ENTRE 18 Y 20, COLONIA SAN MIGUEL KUKAB, EN LA LOCALIDAD DE CALKINÍ, MUNICIPIO DE CALKINÍ, CAMPECHE, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015, ESTANDO PRESENTES PARA ESTE ACTO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, ARQ. PASTOR RAMIRO RODRIGUEZ CUEVAS Y EL RESIDENTE DE OBRA, PROF. JOSE RAYMUNDO CAN PUC, Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA MARIANA PERLA PEREZ RAMIREZ, REPRESENTADO POR LA C. MARIANA PERLA PEREZ RAMIREZ; EL SUPERINTENDENTE DE OBRA LA C. ING. FRANCISCO GERARDO LLADO ZETINA; SE RECIBE FÍSICAMENTE LA OBRA DENOMINADA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE CALKINI Y BECAL, MUNICIPIO DE CALKINÍ, ESTADO DE CAMPECHE; EJECUTADOS CON RECURSOS APROBADOS MEDIANTE OFICIO NUMERO: FISM 2015.-333MAPR001019 Y 333MAPR001020 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2015, PROGRAMA: SG.-ELECTRIFICACION Y SUBPROGRAMA:01.-URBANA. Y CON NUMERO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: HAC-DOP-FISM-06/2015.

LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA FUERON PACTADOS EN EL CONTRATO ANTES MENCIONADO INICIANDO EL 28 DE FEBRERO DEL 2015 Y TERMINANDO EL 14 DE MAYO DE 2015, ES DECIR EN UN PLAZO DE 76 DÍAS NATURALES, EL MONTO CONTRATADO DE \$1, 600,327.78 SIENDO EL MONTO TOTAL DE EJECUCIÓN: \$ 1, 600,327.78 (SON: UN MILLON SEISCIENTOS MIL, TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 78/100 MONEDA NACIONAL) AMBOS CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA.

PRELIMINARES

- SUMINISTRO Y FORJADO DE BASE METALICA TUBULAR PARA COLOCAR LETRERO ROTULADO. (1 PZA)
- TRAZO Y LOCALIZACION DE CEPAS,, ABRIR BRECHA, Y PODA DE ARBUSTOS

POSTES DE CONCRETO

- SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750



DISPOSITIVOS DE MEDIA TENSION

- SUMINISTRO Y COLOCACION TIPO TS30
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO RD20/1TR2B, AISLADOR 13 PD DISPOSITIVOS PARA BANCO DE 10 A 100 KVA A 13.2 KV CON CCF 27 KVA CON CORTACIRCUITO.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITO CCF
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO T20
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO AD20/CCF

DISPOSITIVOS DE BAJA TENSION.

- SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVOS TIPO 1R3.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO TIPO 1R3/1R3
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO 1R371R3/1R3 /1R3
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO 1P3

TRANSFORMADORES.

- SUMINISTRO, MANIOBRA Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA DE DOS BOQUILLAS 132000/220-127.(2 PZA)

CONDUCTORES.

- SUMINISTRO, TENDIDO, TENSIONADO Y CONEXIÓN DE LINEA DE MEDIA TENSION EN 2F-2H CON CABLE SEMIAISLADO ACSR 3/0 (312 ML)
- SUMINISTRO, TENDIDO, TENSIONADO Y CONEXIÓN DE LINEA DE BAJA TENSION DE NEUTRANEL (2+1) AAC 3/0-1/0(3/0 PARA FASE Y 1/0 PARA NEUTRO)

RETENIDA ELECTRICA.

- SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RSA.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA REA
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RBA

TIERRA FISICA.

- SUMINISTRO E INSTALACION DE DE SISTEMA DE TIERRA FISICA "K", INATALACION DE BAJANTE A TIERRA CON CABLE Cu-4AWGR
- SUMINISTRO E INSTALACION DE DE SISTEMA DE TIERRA FISICA "2K", INATALACION DE BAJANTE A TIERRA CON CABLE Cu-4AWGR

LUMINARIAS:

- SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA OV-15 CON BASE TIPO E39 CON UNA POTENCIA MAXIMA DE 150 W, GRADO IP65 A BASE DE MATERIAL DE ALUMINIO, CON BALASTRO EN V/S DE 150 W Y BRAZO DE LUMINARIA

COMPLEMENTARIOS.

- TRAMITE ANTE C.F.E. NECESARIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA ENMTRANDO LA DOCUMENTACION
- PAGO DE RESOLUTIVO PARA INTERCONEXION ANTE C.F.E.

ACOMETIDAS:

FORJADO DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA SERVICIO MONOFASICO CON MUR, BASE DE MEDIDOR, CENTRO DE CARGA, PASSTILLA TERMOMAGNETICA VARILLA E TIERRA, CONECTOR, CABLE No 8 Y MUR DE PREFABRICADO (PEZAS)

Calle 23 (entre 18 y 20) col. Kukab
Calkini, Campeche Mx C.P 24903
Obras@Calkini.gob.mx

www.calkini.gob.mx

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE MICRO OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE





LOS PAGOS A LA EMPRESA CONTRATISTA SE REALIZARON DE LA SIGUIENTE MANERA:


	PERÍODO	IMPORTE ESTIMADO*	IMPORTE PAGADO**	FECHA DE CHEQUE
Anticipo	-----	-----	\$480,098.04	
Uno	28 de febrero al 30 de abril de 2015	\$1021,566.71	\$812,145.54	
Dos (finiquito)	01 de mayo al 14 de mayo del 2015	\$ 358,025.34	\$ 284,630.15	
		\$1,379,592.05	\$1,576,873.73	

*los importes no incluyen I.V.A

**En el importe pagado ya se realizaron las deducciones de Ley.

ANEXO AL PRESENTE SE INTEGRA LA DOCUMENTACION PARA EL PAGO DEL FINIQUITO, LA CUAL INCLUYE:

- 1 PLANO DEFINITIVO DE LA OBRA.
- FIANZA DE VICIOS OCULTOS No 002205A60015 DE FIANZAS DORAMA.
- AVISO DE TERMINO DE OBRA.
- BITACORA.
- CATÁLOGO DEFINITIVO DE OBRA.

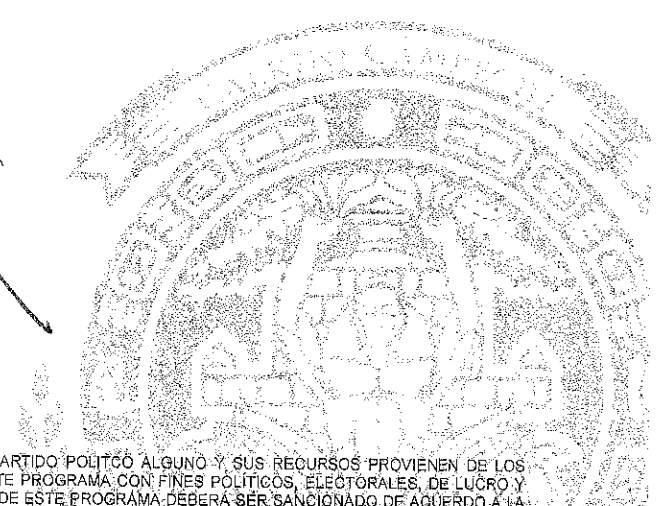

Calle 23 (entre 18 y 20) col. Kukab
Calkini, Campeche Mx C.P 24903
Obras@Calkini.gob.mx

www.calkini.gob.mx



EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DA POR CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y ASI COMO LA RELACION DE CONTRATACION ENTRE AMBAS PARTES. SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL MISMO DIA DE INICIO FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI

PROFR. JOSÉ RAYMUNDO CAN PUC
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. PASTOR R. RODRIGUES CUEVAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

FOR EL CONTRATISTA

ING. FRANCISCO GERARDO LLADO ZETINA.
SUPERINTENDENTE DE LA OBRA

Calle 23 (entre 18 y 20) col. Kukab
Calkini, Campeche Mx C.P 24903
Obras@Calkini.gob.mx

www.calkini.gob.mx

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO O PROMOVIDO POR PARTIDO POLÍTICO, ALGUNOS SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES. ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE PROGRAMA CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES DE LUCHA Y OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS. QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER SANCIONADO DE ACUERDO A LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE.



ASUNTO: NOTIFICACION PARA EL FINIQUITO



H. AYUNTAMIENTO
DE CALKINÍ 2012-2018



Calkiní
progresa

OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

Calkiní, Campeche a 20 de Agosto de 2015

**C. MARIANA PERLA PEREZ RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL**

Por este medio, referente al oficio que nos hizo llegar el día 14 de mayo de 2015 en la que se menciona que los trabajos encomendados a su cargo pertenecientes al contrato No. **HAC-DOP-FISM-06/2015** con fecha 28 de febrero de 2015, relativo a la obra "**Ampliación de la red de energía eléctrica en las localidades de Calkiní y Becal**", Municipio de Calkiní, Campeche, por un monto de **\$1,600,326.78** iva incluido y con un periodo de ejecución de contrato hasta el día **14 de mayo de 2015**, han sido concluidos al 100% motivo por el cual se le invita a llevar a cabo la visita de evaluación conjunta de los trabajos realizados el día **27 de septiembre de 2015** presente año a las **12:00 hrs** en el lugar de la obra.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

un cordial saludo

Atentamente
El Director

Arq. Pastor Ramiro Rodríguez Cuevas

Recibi
20/Ag/15 Ing. Mariana Perez

C.C.P.- ARCHIVO

PRRC/JRCP

