



## SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE OBRA POR PARTE DEL COMITÉ COMUNITARIO

REUNIDOS AUTORIDADES MUNICIPALES E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA COMUNITARIO Y DEMAS BENEFICIARIOS EN EL SITIO DE LA UBICACIÓN DE LA OBRA EN CUESTION, PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ELECTRICA COLONIA MONTECRISTO DE LA LOCALIDAD COLONIA-SIHO, CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI	
FUENTE DE LOS RECURSOS: FAISMUN	
PROGRAMA: S.G.- ELECYTRIFICACION	SUBROGRAMA: SG01B.- AMPLIACION
No. DE BENEFICIARIOS: 78 HABITANTES	
MODALIDAD DE EJECUCION: INVITACION RESTRINGIDA	METAS: 1,372.00 ML
MONTO APROBADO: \$2,634,470.28 /	MONTO EJERCIDO: \$ 2,631,983.16 /

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO SE REALIZA EL SIGUIENTE CUESTIONARIO PARA CONSTATAR SI CUMPLE CON LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

- |   | SI                                  | NO                       |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1.- ¿LA OBRA SE REALIZO EN TIEMPO Y FORMA RESPETANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINO?  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.- ¿LOS CONCEPTOS PROPUESTOS DENTRO DEL PRESUPUESTO SON LOS QUE SE EJECUTARON DENTRO DE LA OBRA?                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3.- ¿DE MANERA PERIODICA O PARCIAL USTEDES COMO BENEFICIARIOS ESTABAN AL PENDIENTE SOBRE EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.- ¿LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA OBRA CUMPLIERON CON LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE ACUERDO AL PRESUPUESTO?             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.- ¿LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO?  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.- ¿ESTAN DE ACUERDO CON EL BENEFICIO QUE LES VA A PROPORCIONAR ESTA OBRA PARA EL BIENESTAR DE USTEDES Y DE SUS FAMILIAS?      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |




## SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE OBRA POR PARTE DEL COMITÉ COMUNITARIO

UNA VEZ QUE EL COMITÉ DE LA OBRA EN MENCIÓN ACEPTO LA ENTREGA-RECEPCION POR PARTE DE LA DIRECCION EJECUTORA, ASI COMO DEL CONTRATISTA, Y NO HABIENDO MAS ASUNTO FIRMAN AL CALCE LAS PARTE BENEFICIADAS, ASI COMO LAS AUTORIDADES QUE INTERVIENEN EN ESTE DOCUMENTO.

EN LA LOCALIDAD DE COLONIA-SIHO, CALKINI MUNICIPIO DE CALKINI, ESTADO DE CAMPECHE SIENDO LAS 11:50 HORAS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2026 , SE FIRMA EL SIGUIENTE DOCUMENTO QUE AVALA QUE LA OBRA ESTA SIENDO RECIBIDA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE MENCIONA EL CONTRATO; ASI COMO EL EXPEDIENTE TECNICO, SUS CONCEPTOS CALIDAD DE MATERIAL Y MANO DE OBRA.


### POR EL COMITÉ DE OBRA

  
Keila Raquel Canul May

PRESIDENTE DEL COMITÉ

  
Francisco J. Chi Canche

SECRETARIO DEL COMITÉ


  
Gerardo Co uoh Hu chin


VOCAL 1

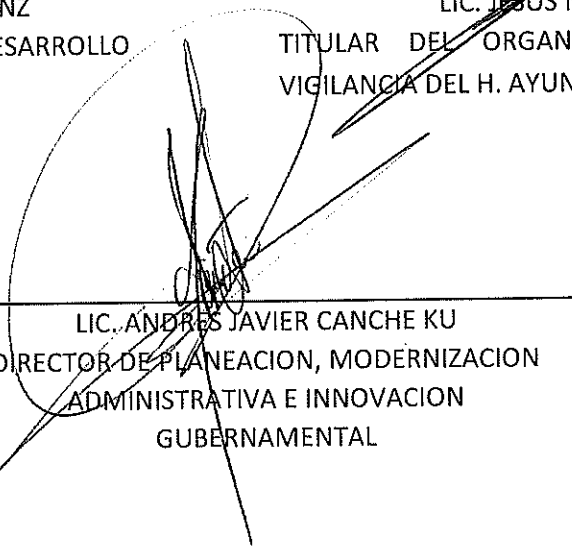
  
Julio Cesar Co uoh Co uoh

VOCAL 2

### POR LAS AUTORIDADES MUNICIPALES

  
ING. VIVIANA ELIDE RUZ SAÉNZ  
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO  
URBANO Y TERRITORIAL

  
LIC. JESUS NAZARENO COLLI CHI  
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL Y  
VIGILANCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI

  
LIC. ANDRÉS JAVIER CANCHE KU  
DIRECTOR DE PLANEACION, MODERNIZACION  
ADMINISTRATIVA E INNOVACION  
GUBERNAMENTAL
