


INDICADORES DE GESTION (POA 2010)

| | |
|------------------------------------|---------------|
| INDICADOR DE GESTION: | 94.62% |
| Avance total de obras en ejecución | |

ESTADISTICA DE AVANCE DE OBRA

| | |
|---------------------|----|
| OBRAS PROGRAMADAS: | 37 |
| OBRAS EN EJECUCION: | 0 |
| OBRAS SIN INICIAR: | 0 |
| OBRAS TERMINADAS: | 37 |

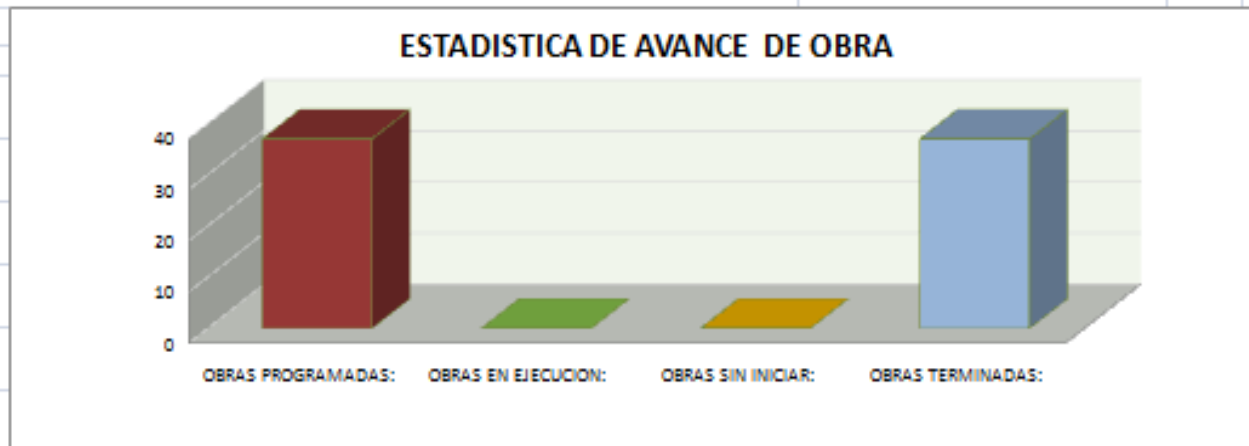

AVANCE FISICO DE OBRAS 4 de marzo de 2011


| LOCALIDAD | OBRA | RECURSOS | AV. FISICO |
|------------------------|---|---------------------------|------------|
| Bacabchén | Ampliacion del Sistema de Agua Potable. | R-33 FISM - CDI 2010 | 100 % |
| San Antonio Sahcabchén | Ampliacion del Sistema de Agua Potable | R-33 FISM - CDI 2010 | 100 % |
| Concepción | Ampliacion de red de Agua potable . | R-33 FISM - CDI 2010 | 100 % |
| Calkini, C.M. | Aplicación de Slurry | RECURSOS MUNICIPALES 2010 | 100 % |
| Chunhuás | Ampliacion de red de agua potable y rehabilitación de sistema de agua | R-33 FISM - CDI 2010 | 100 % |
| Dzitbalché | Ampliación de la Red de Energía Eléctrica | R-33 FISM - CDI 2010 | 100 % |
| Dzitbalché | Rehabilitación de Calles | R-33 FISM - 2010 | 100 % |
| Nunkini | Ampliacion del Sistema de Agua Potable | R-33 FISM - CDI 2010 | 100 % |
| Xcacoach | Ampliación de la Red de Energia Electrica. | R-33 FISM - CDI 2010 | 100 % |
| Becal | Ampliación de Red de Energía Eléctrica | R-33 FISM - 2010 | 100 % |
| Calkini, C.M. | Construccion de Registros para Drenaje Pluvial | R-33 FISM - HABITAT 2010 | 100 % |
| Calkini, C.M. | Ampliacion de la Red de Agua Potable | R-33 FISM - HABITAT 2010 | 100 % |
| Calkini, C.M. | Construccion de Pozos Para Drenaje Pluvial | R-33 FISM - HABITAT 2010 | 100 % |

| | | | | |
|-------------------|---|---|------|---|
| Calkini, C.M. | Ampliacion de la Red de Energia Electrica Ceibo | R-33 FISM - HABITAT 2010 | 100 | % |
| Calkini, C.M. | Ampliacion de la Red de Energia Electrica San Martin | R-33 FISM - HABITAT 2010 | 100 | % |
| Pucnachen | Construcción de Cocina Escolar | R-33 FISM - 2010 | 100 | % |
| Santa Maria | Construcción de Calles | R-33 FISM - 2010 | 100 | % |
| Santa Cruz Pueblo | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable | R-33 FISM - 2010 | 100 | % |
| Calkini, C.M. | Amp. de Red de Energía Eléc. En Calle 22B, Col. Fátima | R-33 FISM - 2010 | 100 | % |
| Calkini, C.M. | Rehabilitación de Calles | R-33 FISM - 2010 | 100 | % |
| Calkini, C.M. | Construcción de Guarniciones y Banquetas | R-33 FISM, HABITAT 2010 | 100 | % |
| Calkini, C.M. | Pavimentación de Calles | R-33 FISM, HABITAT 2010 | 100 | % |
| Calkini, C.M. | Ampliación de Red de Energía Eléctrica | R-33 FISM, HABITAT 2010 | 100 | % |
| Calkini, C.M. | Construccion de Pasos Peatonales | R-33 FISM, HABITAT 2010 | 100 | % |
| Calkini, C.M. | Contruccion de Andadores | R-33 FISM-HABITAT 2010 | 100 | % |
| Varias | Programa TU CASA | R-33 FISM-FONHAPO 2010 | 100 | % |
| Varias | Construccion de Recamara Adicional Urbana | R-33 FISM-FONHAPO 2010 | 100% | |
| | (Esta última obra fue ejecutada por la Administración actual, cabe mencionar que no entra en el POA 2010) | | | |
| Calkini, C.M. | Ampliacion de la Red de Agua Potable | R-33 FISM - 2010 | 100 | % |
| Calkini, C.M. | Construccion del Arriate para el Arbol del Bicentenario | R. MUNICIPALES - 2010 | 100 | % |
| Calkini, C.M. | Restauracion del Arco Conmemorativo de la Fundacion de Calkini | R. MUNICIPALES - 2010 | 100 | % |
| Tepakan | Rehabilitacion del Sistema de Agua Potable en Tepakan | R-33 FISM - 2010 | 100 | % |
| Calkini, C.M. | Construccion del Parque del Ceibo | HIDROCARBUROS - HABITAT | 100 | % |
| Calkini, C.M. | Construccion del parque Ecologico 1a. Etapa | HIDROCARBUROS - HABITAT | 100 | % |
| Calkini, C.M. | Ampliacion de la Red de Agua Potable | AHORRO PRESUPUESTAL- HABITAT | 100 | % |
| Calkini, C.M. | Construccion de Pozos para drenaje Pluvial (4 pozos) | R-33 FISM -HABITAT 2010 | 100 | % |
| Tepakan | Ampliacion de la Red de Energia Electrica | R-33 FISM - 2010 | 100 | % |
| Calkini, C.M. | Construccion de Pozos para drenaje Pluvial (2 pozos) | AHORRO PRESUPUESTAL DEL RAMO 33 FISM | 100 | % |

INDICADORES DE GESTION (FOPAM - 2010)

| | |
|------------------------------------|----------------|
| INDICADOR DE GESTION: | 100.00% |
| Avance total de obras en ejecucion | |

ESTADISTICA DE AVANCE DE OBRA

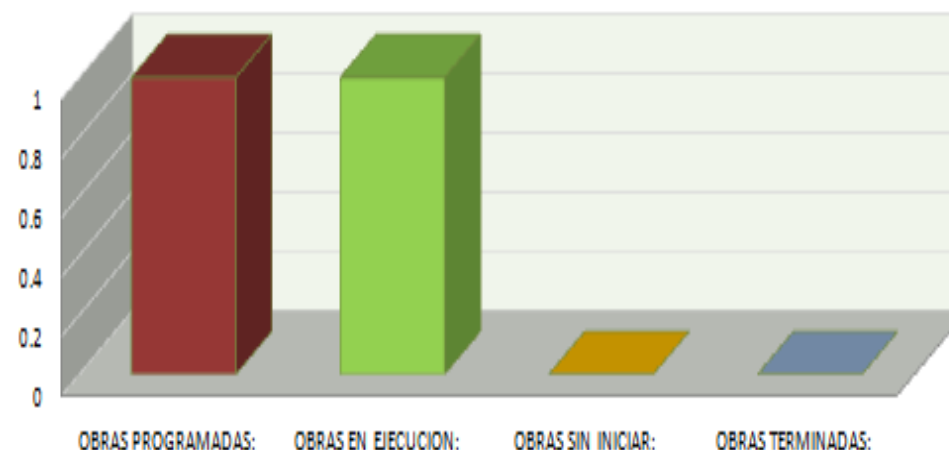

| ESTADISTICA DE AVANCE DE OBRA | |
|-------------------------------|---|
| OBRAS PROGRAMADAS: | 1 |
| OBRAS EN EJECUCION: | 1 |
| OBRAS SIN INICIAR: | 0 |
| OBRAS TERMINADAS: | 0 |


AVANCE FISICO DE OBRAS **4 de marzo de 2011**

| LOCALIDAD | OBRA | RECURSOS | AV. FISICO | |
|------------------|-------------------------|------------|------------|---|
| Dzitbalche, C.M. | Pavimentacion de Calles | FOPAM 2010 | 100 | % |

INDICADORES DE GESTION (FAFEF - 2010)

| | |
|------------------------------------|----------------|
| INDICADOR DE GESTION: | 100.00% |
| Avance total de obras en ejecucion | |

| ESTADISTICA DE AVANCE DE OBRA | |
|-------------------------------|---|
| OBRAS PROGRAMADAS: | 1 |
| OBRAS EN EJECUCION: | 0 |
| OBRAS SIN INICIAR: | 0 |
| OBRAS TERMINADAS: | 1 |

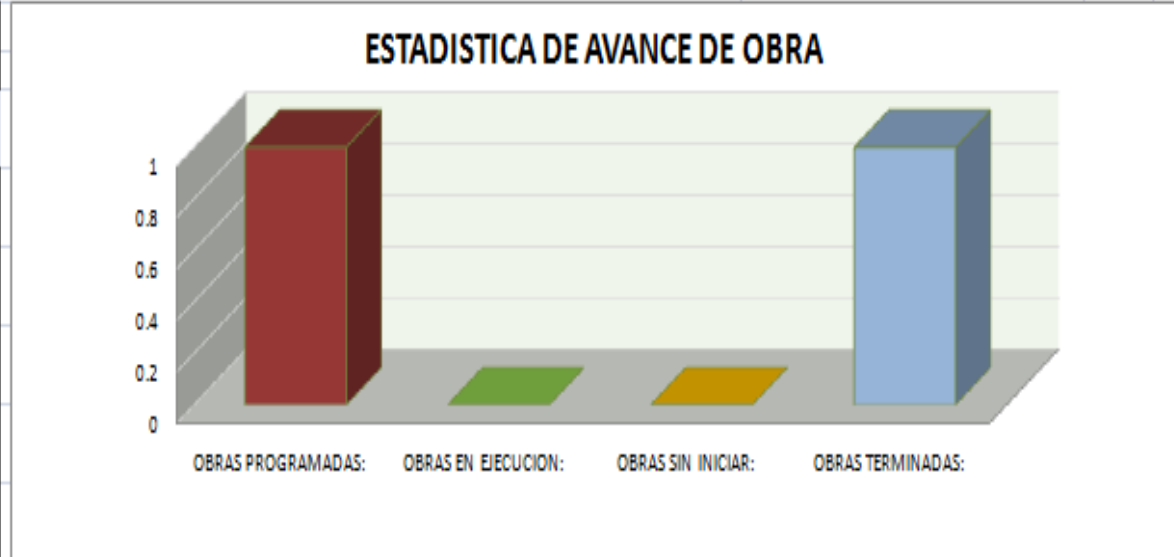

AVANCE FISICO DE OBRAS **4 de marzo de 2011**

| LOCALIDAD | OBRA | RECURSOS | AV. FISICO | |
|-----------|--|------------|------------|---|
| Bacabchen | Construccion de Cocina Escolar para la atencion a la Escuela Primaria General, Pedro Baranda Quijano | FAFEF 2010 | 100 | % |

INDICADORES DE GESTION (BANOBRAS - FISM RAMO 33)

INDICADOR DE GESTION:

88.75%

Avance total de obras en ejecucion

ESTADISTICA DE AVANCE DE OBRA

OBRAS PROGRAMADAS:

8

OBRAS EN EJECUCION:

4


OBRAS SIN INICIAR:

0

OBRAS TERMINADAS:

4

ESTADISTICA DE AVANCE DE OBRA

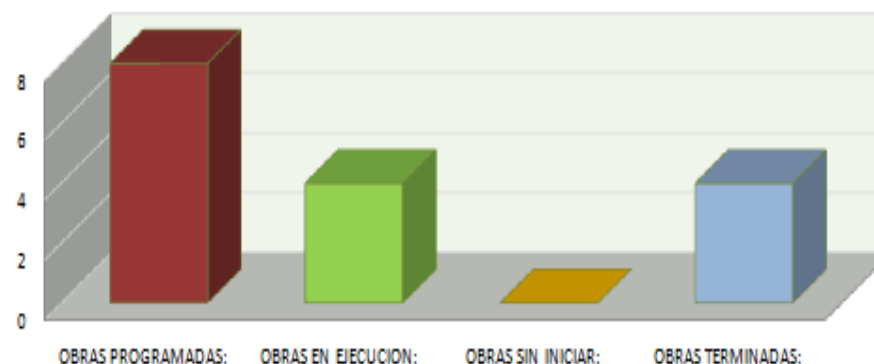

AVANCE FISICO DE OBRAS

4 de marzo de 2011

| LOCALIDAD | OBRA | RECURSOS | AV. FISICO | |
|---------------|--|----------------------------|------------|---|
| Calkini, C.M. | Sellado de Calles | BANOBRAS 2010-FISM RAMO 33 | 40 | % |
| Calkini, C.M. | Reconstruccion de Calles | BANOBRAS 2010-FISM RAMO 33 | 100 | % |
| Calkini, C.M. | Construccion de Calles en Circuitos Suroeste | BANOBRAS 2010-FISM RAMO 33 | 100 | % |
| Calkini, C.M. | Construccion de Calle 19 % 14 y ciclopista | BANOBRAS 2010-FISM RAMO 33 | 100 | % |
| Becal | Reconstruccion de Calles | BANOBRAS 2010-FISM RAMO 33 | 100 | % |
| Becal | Pavimentacion de Calles | BANOBRAS 2010-FISM RAMO 33 | 90 | % |
| Becal | Construccion de Guarniciones y Banquetas | BANOBRAS 2010-FISM RAMO 33 | 90 | % |
| Becal | Alumbrado en avenida | BANOBRAS 2010-FISM RAMO 33 | 90 | % |
