



SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO (PAIP 2026)



RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-2026)

FECHA: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026

MONTO AUT. (FAISMUN). 2026:

\$ 84,730,971.00

MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO):

\$ 50,838,583.00

NÚMERO	RUBRO	CLASIFICACIÓN POR RUBRO	SEÍAS	MODALIDAD	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACIÓN DE LA OBRA	No. OFICIO DE APROBACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	MONTO APROBADO	PERIODO DE EJECUCIÓN		INVERSIÓN EN EL TRIMESTRE (PESOS)					AVANCE		% DE EJECUCIÓN DEL LOS REC. EN EL AÑO X TRIM.	ESTADO Y/O SITUACIÓN DE LA OBRA			
												INICIO	TERMINO					FÍSICO		FINANCERO					
												REAL	REAL	MONTO CONTRATADO Y/O MODIFICADO	EJERCIDA (FAISMUN)	ACUMULADO (FAISMUN)	POR EJERCER (CONTRATADO - ACUMULADO)	SALDOS (CONTRATADO - ACUMULADO)	TRIM%	ACUM %			TRIM %	ACUM %	
PROGRAMA																									
1	IND	GASTOS DE INDIRECTOS	8354	ARRENDAMIENTO	AUT26MD1001001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SUPERVISIÓN DE OBRA	VARIOS	IT	R33MAPR001001	12-may-26	\$ 2,172,800.00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA	
OBRA PUBLICA																									
1	URB	URBANIZACIÓN	146702	CONSTRUCCIÓN	AUT26M1001001	CONSTRUCCION DE CALLE CON BASE HIDRAULICA UNIENDO LA COL. FATIMA , COL. SAN ROMAN Y COL. LA SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE CALKINI	CALKINI	IT	R33MAPR001001	08-may-26	\$ 974,377.99	18-may-26	22-jun-26	\$ 972,332.35	\$ 972,323.74	\$ 972,323.74	\$ -	\$ 8.61	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	1.15%	TERMINADA	
2	URB	URBANIZACIÓN	146727	CONSTRUCCIÓN	AUT26M1001002	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD AGROPECUARIA TU CK PLANTEEN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO	SANTA CRUZ PUEBLO	IT	R33MAPR001002	11-may-26	\$ 1,318,096.63	27-may-26	10-jul-26	\$ 1,316,479.68	\$ 394,943.90	\$ 394,943.90	\$ 921,535.78	\$ -	65.00%	65.00%	30.00%	0.00%	0.47%	EN PROCESO	
3	URB	URBANIZACIÓN	149816	CONSTRUCCION	AUT26M1001003	CONSTRUCCION DE CALLE CON BASE HIDRAULICA EN LA CALLE 20A ENTRE CALLE 33 Y 37, CALLE 37 ENTRE CALLE 20A Y 16 Y CALLE 8N ENTRE CALLE 16 Y 14 BARRIO LA SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE BECAL	BECAL	IT	R33MAPR001003	14-may-26	\$ 1,842,912.67	27-may-26	27-jul-26	\$ 1,839,853.74	\$ 1,839,848.29	\$ 1,839,848.29	\$ -	\$ 5.45	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	2.17%	TERMINADA	
4	URB	URBANIZACIÓN	149604	CONSTRUCCION	AUT26M1001004	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD HORTICOLA SAN BARTOLO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE NUNKINI	SANTA FE, NUNKINI	IT	R33MAPR001004	14-may-26	\$ 413,437.61	01-jun-26	30-jun-26	\$ 412,839.59	\$ 412,839.59	\$ 412,839.59	\$ -	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.49%	TERMINADA	
5	URB	URBANIZACIÓN	150679	CONSTRUCCION	AUT26M1001005	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD AGRICOLA AGROPECUARIA PIÑUELA EN LA LOCALIDAD DE NINGUNO, NUNKINI	NINGUNO, NUNKINI	IT	R33MAPR001005	14-may-26	\$ 1,608,473.63	03-jun-26	17-jul-26	\$ 1,605,002.66	\$ 481,800.80	\$ 481,800.80	\$ 1,124,201.86	\$ -	30.00%	30.00%	30.00%	0.00%	0.57%	EN PROCESO	
6	URB	URBANIZACIÓN	151544	CONSTRUCCION	AUT26M1001006	CONSTRUCCION DE CALLE CON BASE HIDRAULICA CALLE 8N ENTRE CARRETERA NUNKINI Y CALLE 20 BARRIO EL GATO NEGRO LOCALIDAD DE NUNKINI	NUNKINI	IT	R33MAPR001006	14-may-26	\$ 520,709.22	01-jun-26	30-jun-26	\$ 520,709.22	\$ 155,693.16	\$ 155,693.16	\$ 365,016.06	\$ -	70.00%	70.00%	28.90%	0.00%	0.18%	EN PROCESO	
7	MEV	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	153422	CONSTRUCCION	AUT26M1001007	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XCACOC	XCACOC	IT	R33MAPR001007	01-jun-26	\$ 700,572.41	12-jun-26	27-jun-26	\$ 699,463.44	\$ 209,839.03	\$ 209,839.03	\$ 489,624.41	\$ -	50.00%	50.00%	30.00%	0.00%	0.25%	EN PROCESO	
8	URB	URBANIZACIÓN	157093	CONSTRUCCION	AUT26M1001008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AMPLIACION DIVINO NIÑO POR CALLE 13, LOCALIDAD CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI	CALKINI	IT	R33MAPR001008	03-jun-26	\$ 1,196,694.85	25-jun-26	24-jul-26	\$ 1,195,462.72	\$ -	\$ -	\$ 1,195,462.72	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	EN PROCESO	
9	URB	URBANIZACIÓN	155788	REHABILITACION	AUT26M1001009	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 32 ENTRE 35, 37 Y TRIGESIMO SEPTIMA, EN LA LOCALIDAD DE BECAL, MUNICIPIO DE CALKINI	BECAL	IT	R33MAPR001009	03-jun-26	\$ 2,318,957.53			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA	
10	URB	URBANIZACIÓN	157246	REHABILITACION	AUT26M1001010	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 15 ENTRE 14 Y 18, CALLE 17 ENTRE 22 Y 18, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EXHACIENDA, MUNICIPIO DE CALKINI	SANTA CRUZ EXHACIENDA	IT	R33MAPR001010	03-jun-26	\$ 2,458,466.20			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA	
11	URB	URBANIZACIÓN	160690	CONSTRUCCION	AUT26M1001011	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR, EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI	CALKINI	IT	R33MAPR001011	03-jun-26	\$ 2,990,604.66			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA	
12	URB	URBANIZACIÓN	161084	CONSTRUCCION	AUT26M1001012	CONSTRUCCION DE LA CALLE PARALELA A FFCC POR CALLE 20, EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI	CALKINI	IT	R33MAPR001012	14-jun-26	\$ 1,659,359.11	26-jun-26	30-jul-26	\$ 1,659,359.11	\$ -	\$ -	\$ 1,659,359.11	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	EN PROCESO	
13	URB	URBANIZACIÓN	155939	CONSTRUCCION	AUT26M1001013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SIN NUMERO POR CALLE 28, COLONIA CARLOS RIVAS, EN LA LOCALIDAD DE BECAL, MUNICIPIO DE CALKINI	BECAL	IT	R33MAPR001013	04-jun-26	\$ 1,416,309.93			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA	
14	URB	URBANIZACIÓN	160918	CONSTRUCCION	AUT26M1001014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE POR TANQUE ELEVADO SAN ROMAN, EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI	CALKINI	IT	R33MAPR001014	05-jun-26	\$ 649,600.00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA	
15	ALC	ALCANTARILLADO	161004	CONSTRUCCION	AUT26M1001015	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE 32 ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, EN LA LOCALIDAD BECAL, MUNICIPIO DE CALKINI	BECAL	IT	R33MAPR001015	05-jun-26	\$ 275,350.48			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA	
16	URB	URBANIZACIÓN	164666	CONSTRUCCION	AUT26M1001016	CONSTRUCCION DE CALLE CON BASE HIDRAULICA EN LA CALLE 8N POR CALLE 22 BARRIO KILAKAN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI	CALKINI	IT	R33MAPR001016	08-jun-26	\$ 465,617.41	22-jun-26	21-jul-26	\$ 464,709.24	\$ -	\$ -	\$ 464,709.24	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	EN PROCESO	
17	URB	URBANIZACIÓN	162748	CONSTRUCCION	AUT26M1001017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ENTRE CALLE 22C Y BARRIO SAN ROMAN, EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI	CALKINI	IT	R33MAPR001017	09-jun-26	\$ 1,250,313.67			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA	
18	MEV	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	165713	CONSTRUCCION	AUT26M1001018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN CHUNHUAS	SAN AGUSTIN CHUNHUAS	IT	R33MAPR001018	10-jun-26	\$ 700,572.41	22-jun-26	05-ago-26	\$ 697,251.05	\$ 209,175.92	\$ 209,175.92	\$ 488,077.14	\$ -	40.00%	40.00%	30.00%	0.00%	0.25%	EN PROCESO	



SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO (PAIP 2026)



RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-2026)

FECHA: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026

MONTO AUT. (FAISMUN). 2026: \$ 84,730,971.00
MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO): \$ 50,838,583.00

NUMERO	RUBRO	CLASIFICACION POR RUBRO	SIFAS	MODALIDAD	No. DE OBRA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	No. OFICIO DE APROBACION	FECHA DE APROBACION	MONTO APROBADO	PERIODO DE EJECUCION		INVERSION EN EL TRIMESTRE (PESOS)					AVANCE				% DE EJECUCION DE LOS REC. EN EL AÑO X TRIM.	ESTADO Y/O SITUACION DE LA OBRA	
												INICIO	TERMINO	MONTO CONTRATADO Y/O MODIFICADO	EJERCIDA (FAISMUN)	ACUMULADO (FAISMUN)	POR EJERCER (CONTRATADO - ACUMULADO)	SALDOS (CONTRATADO - ACUMULADO)	FISICO		FINANCIERO				
												REAL	REAL						TRIM %	ACUM %	TRIM %	ACUM %			
19	URB	URBANIZACION	162025	CONSTRUCCION	AUT26/M1001019	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD AGRICOLA SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI	NUNKINI	IT	R33MAPR001019	12-jun-26	\$ 986,052.00	23-jun-26	31-jul-26	\$ 985,405.43	\$ -	\$ -	\$ 985,405.43	\$ -	40.00%	40.00%	0.00%	0.00%	0.00%	EN PROCESO	
20	MEV	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	157366	CONSTRUCCION	AUT26/M1001020	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUCNACHEN	PUCNACHEN	IT	R33MAPR001020	12-jun-26	\$ 1,054,632.85	23-jun-26	21-ago-26	\$ 1,053,999.26	\$ 316,190.78	\$ 316,190.78	\$ 737,778.48	\$ -	10.00%	10.00%	30.00%	0.00%	0.37%	EN PROCESO	
21	URB	URBANIZACION	163663	REHABILITACION	AUT26/M1001021	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN, MUNICIPIO DE CALKINI	tepankan	IT	R33MAPR001021	12/06/2026	\$ 997,312.08			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA	
22	URB	URBANIZACION	164977	REHABILITACION	AUT26/M1001022	REHABILITACION DE LA TECHUMBRE DE GRADAS DE CAMPO DE BEISBOL , EN LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA, MUNICIPIO DE CALKINI	isla arena	IT	R33MAPR001022	16-jun-26	\$ 1,919,823.97			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA	
23	URB	URBANIZACION	165755	CONSTRUCCION	AUT26/M1001023	CONSTRUCCION DE CALLE CON BASE HIDARULICA EN LA CALLE S/N ENTRE CALLE 22A Y CALLE 22B COLONIA DE FATIMA, ATRÁS DEL CBTS 126 EN LA LOCALIDAD DE CALKINI	calkini	IT	R33MAPR001023	16-jun-26	\$ 671,293.50			\$ 669,695.12	\$ -	\$ -	\$ 669,695.12	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	EN PROCESO	
24	APO	AGUA POTABLE	163125	AMPLIACION	AUT26/M1001024	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE S/N POR CALLE 28 EN LA COLONIA CARLOS RIVAS, EN LA LOCALIDAD DE BECAL, MUNICIPIO CALKINI	calkini	IT	R33MAPR001024	17-jun-26	\$ 776,997.00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA	
25	MEV	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	167202	CONSTRUCCION	AUT26/M1001025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI	NUNKINI	IT	R33MAPR001025	17-jun-26	\$ 1,054,632.85	26-jun-26	24-ago-26	\$ 1,053,354.11	\$ -	\$ -	\$ 1,053,354.11	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	EN PROCESO	
26	MEV	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	171213	construccion	AUT26/M1001026	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI	calkini	IT	R33MAPR001026	23-jun-26	\$ 2,609,472.47			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA	
27	URB	URBANIZACION	166741	construccion	AUT26/M1001027	CONSTRUCCIÓN DE CALLE BASE HIDRÁULICA EN LA CALLE 12 ATRÁS DEL CBTS 126 EN LA LOCALIDAD DE CALKINI	calkini	IT	R33MAPR001027	24-jun-26	\$ 717,541.29			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA	
28	URB	URBANIZACION	163063	construccion	AUT26/M1001028	CONSTRUCCION DE CALLE BASE HIDRÁULICA EN LA CALLE 24 POR CALLE 21 Y CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE PUCNACHEN	pucnachen	IT	R33MAPR001028	24-jun-26	\$ 392,161.66			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA	
29	URB	URBANIZACION	172809	rehabilitacion	AUT26/M1001029	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO COLONIAL EN LA CALLE 20 ENTRE AV. EDUARDO BAEZA GARCIA Y CALLE 21 EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, EN EL MUNICIPIO DE CALKINI	calkini	IT	R33MAPR001029	25-jun-26	\$ 1,689,835.32			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA	
30	URB	URBANIZACION	173208	rehabilitacion	AUT26/M1001030	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO PRINCIPAL EN EL AREA DE JUEGOS INFANTILES EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI	calkini	IT	R33MAPR001030	25-jun-26	\$ 4,547,607.43			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA	
31	APO	AGUA POTABLE	172847	AMPLIACION	AUT26/M1001031	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE 31A ENTRE CALLE 22 Y CALLE 29, EN EL BARRIO DE KILAKAN , EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI	CALKINI	IT	R33MAPR001031	29-jun-26	\$ 758,509.87			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA	
TOTALES												\$ 43,313,098.88			\$ 15,146,888.73	\$ 4,992,655.21	\$ 4,992,655.21	\$ 10,154,219.46	\$ 14.06						

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.D.E.E. MILTON UUSAS MILLÁN ATOCHE
(PRESIDENTE DEL COPLADEMUN)

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO,
AGROPECUARIO, DE INCLUSION Y
BIENESTAR SOCIAL

ING. FLORIBERTO VILLALBA TURRIZA
(ASESOR TECNICO DE DESARROLLO SOCIAL)

DIRECTORA DE PLANEACION, MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA E INNOVACION
GOBIERNAMENTAL

ING. ARIADNA HERNANDEZ RUEDA
(COORDINADORA GENERAL DEL COPLADEMUN)

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL

ING. VIVIANA ELIZABETH RUZ SANZ
(ASESORA TECNICA DE OBRAS PUBLICAS)

DIRECTOR DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

M.A.I. ANDRES JAVIER CANCHE KU



EL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CALKINI, CAMPECHE
2024 - 2027
DIRECCION DE PLANEACION
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
E INNOVACION GOBIERNAMENTAL

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

ING. DIEGO FERNANDO FLORES CANTON
(ASESOR TECNICO DE FINANZAS)

DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. JESUS NAZARENO COLDI CHI
(JEFEC DE CONTROL Y VIGILANCIA)



RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-2026)



INDICADORES DE GESTION
01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026

MONTO AUT. FAISMUN. 2026: \$ 84,730,971.00
MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE
(ACUMULADO) \$ 50,838,583.00

CONCEPTOS (RUBRO DE GASTO)	INVERSION PRESUPUESTADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION CONTRATADA	INVERSION EJERCIDA AL TRIMESTRE	INVERSION ACUMULADA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA AL TRIMESTRE
AGUA POTABLE	\$ 3,275,836.64	\$ 3,275,836.64				0.00%
ALCANTARILLADO	\$ 1,400,980.25	\$ 1,400,980.25				0.00%
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	\$ 4,171,886.21	\$ 4,171,886.21				0.00%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 18,283,307.00	\$ 18,283,307.00	\$ 3,504,039.87	\$ 735,205.73	\$ 735,205.73	0.87%
URBANIZACION	\$ 53,611,541.48	\$ 53,611,541.48	\$ 11,642,848.86	\$ 4,257,449.48	\$ 4,257,449.48	5.02%
PROGRAMA DE INDIRECTOS 3%	\$ 2,292,800.00	\$ 2,292,800.00				0.00%
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PRODIMDF 2%	\$ 1,694,619.42	\$ 1,694,619.42				0.00%
TOTALES	84,730,971.00	84,730,971.00	\$ 15,146,888.73	\$ 4,992,655.21	\$ 4,992,655.21	5.89%




RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-2026)



INDICADORES DE GESTION 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026

MONTO AUT. FAISMUN. 2026: \$ 84,730,971.00
MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO) \$ 50,838,583.00

INDICADORES DE GESTION

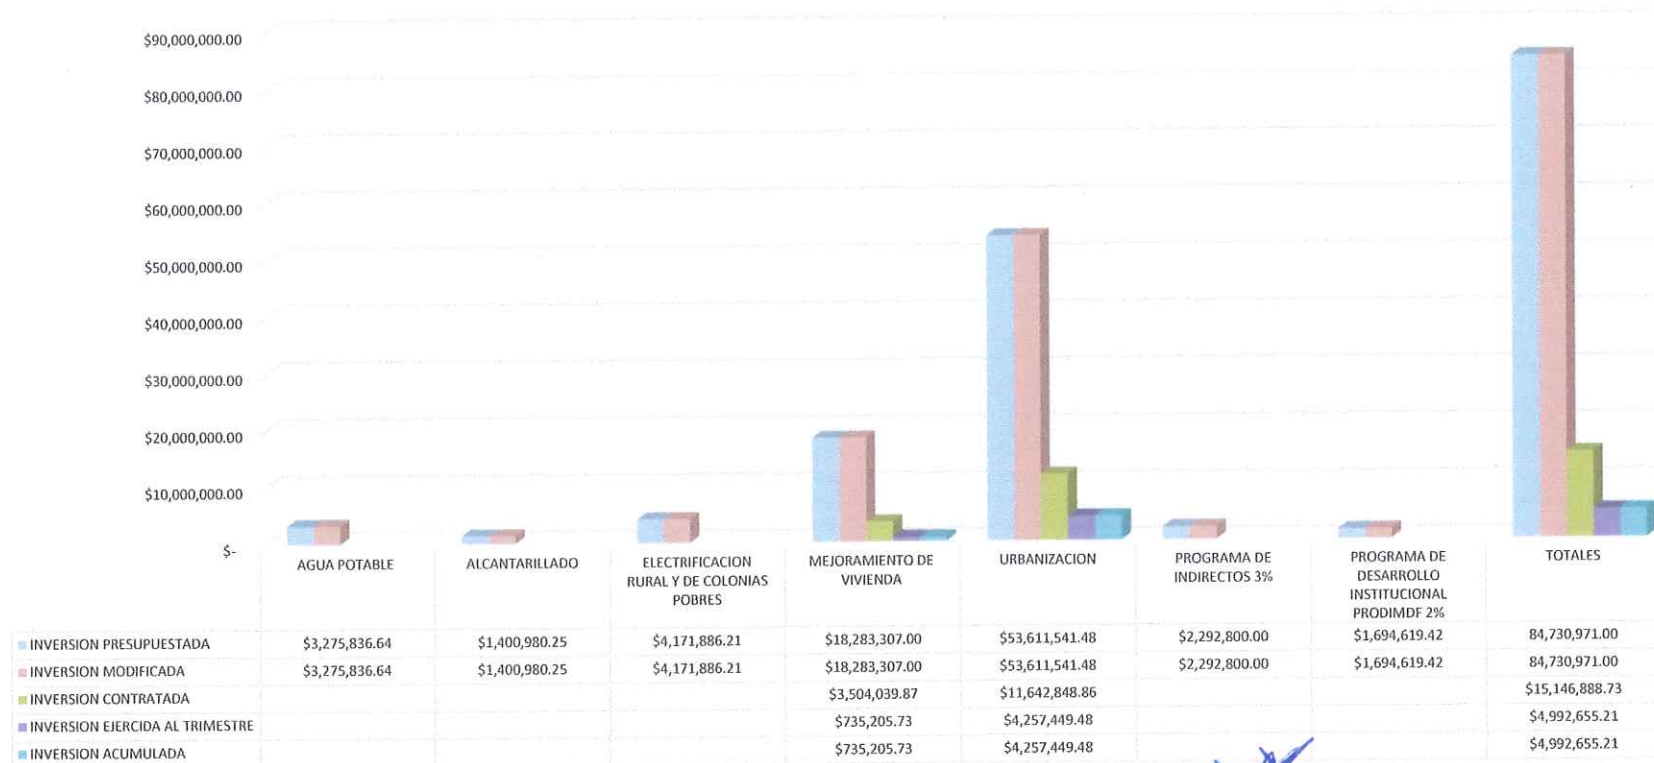

Segundo Avance Trimestral (Abril - Junio 2026)




RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-2026)



INDICADORES DE GESTION

01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026

MONTO AUT. FAISMUN. 2026: \$ 84,730,971.00
MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO) \$ 50,838,583.00

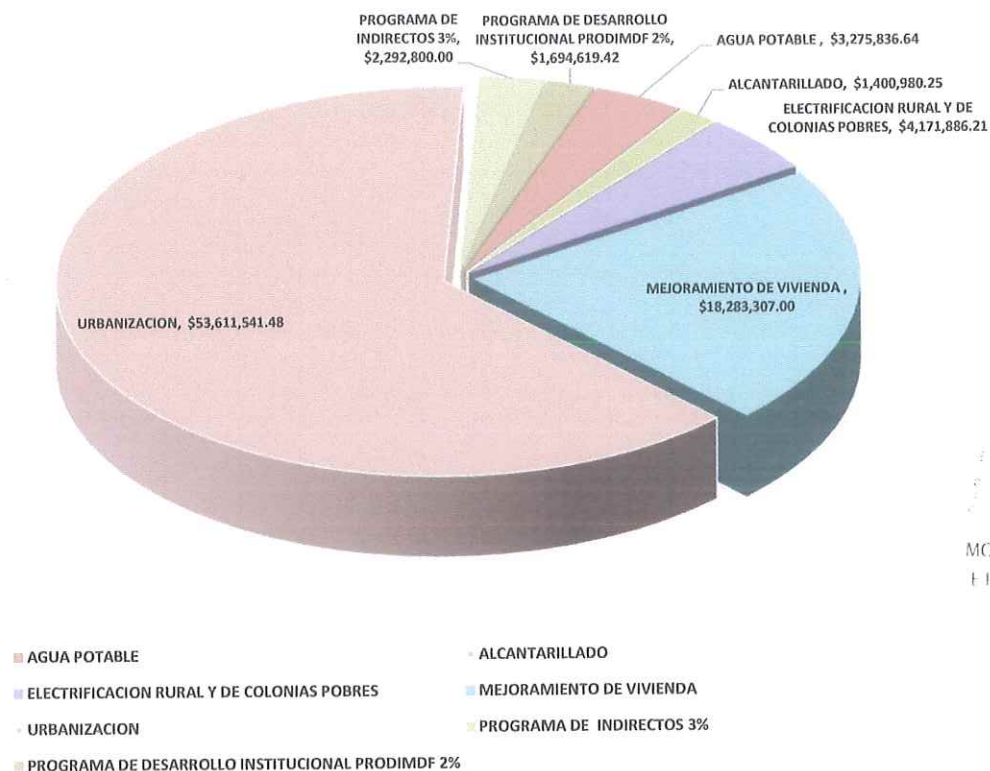

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CAL KINI, CAMPECHE
2024-2027
DIRECCION DE PLANEACION
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
E INNOVACION GUBERNAMENTAL

DIRECTORA DE PLANEACION, MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL

ING.- ARIADNA HERRERA RUEDA
(COORDINADORA GENERAL DEL COPLADEMUN)

Segundo Avance Trimestral (Abril - Junio 2026)



RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-2026)



PERIODO TRIMESTRAL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026

MONTO AUT. FAISMUN. 2026: \$ 84,730,971.00
MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO): \$ 50,838,583.00

INDICADOR DE DESEMPEÑO

			RECURSOS EJERCIDOS EN EL TRIMESTRE					
CONCEPTOS (RUBRO DE GASTO)		INVERSION MODIFICADA	(FAISMUN) 2026				Total	Porc.
			1 Ene-Mar	2 Abr-Jun	3 Jul-Sep	4 Oct-Dic		
SERVICIOS BASICOS	AGUA POTABLE.	\$ 3,275,836.64	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	0.00%
	ALCANTARILLADO	\$ 1,400,980.25	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	0.00%
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	\$ 4,171,886.21	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	0.00%
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 18,283,307.00	\$ -	\$ 735,205.73		\$ -	\$ 735,205.73	0.87%
	URBANIZACION	\$ 53,611,541.48	\$ -	\$ 4,257,449.48		\$ -	\$ 4,257,449.48	5.02%
INTEGRACION Y DESARROLLO	PROGRAMA DE GASTOS DE INDIRECTOS 3%	\$ 2,292,800.00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	0.00%
	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PRODIMDF 2%	\$ 1,694,619.42	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	0.00%
			\$ -					
TOTALES		\$ 84,730,971.00	\$ -	\$ 4,992,655.21	\$ -	\$ -	\$ 4,992,655.21	5.89%

DIRECTORA DE PLANEACION, MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL

ING.- ARIADNA HERRERA RUEDA
(COORDINADORA GENERAL DEL COPLADEMUN)

EL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CALAKMUL, CAMPECHE
2024 - 2027
DIRECCION DE PLANEACION
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
E INNOVACION GUBERNAMENTAL



RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-2026)



PERIODO TRIMESTRAL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026
MONTO AUT. FAISMUN. \$ 84,730,971.00
MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO) \$ 50,838,583.00

INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO POR OBRA (FAISMUN)

ESTADISTICA DE AVANCE DE OBRA	N° DE OBRAS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION ACUMULADA	INVERSION POR EJERCER
OBRAS PROGRAMADAS PRIMER TRIMESTRE	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OBRAS PROGRAMADAS SEGUNDO TRIMESTRE	31.00	\$ 41,140,298.88	\$ 4,992,655.21	\$ 4,992,655.21	\$ 36,147,643.67
OBRAS PROGRAMADAS TERCER TRIMESTRE	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OBRAS PROGRAMADAS CUARTO TRIMESTRE	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 41,140,298.88	\$ 4,992,655.21	\$ 4,992,655.21	\$ 36,147,643.67

INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO POR ACCION (INDIRECTOS)

ESTADISTICA DE AVANCE DE ACCIONES (IND)	N° DE ACCIONES	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION ACUMULADA	INVERSION POR EJERCER
ACCIONES PROGRAMADAS PRIMER TRIMESTRE	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACCIONES PROGRAMADAS SEGUNDO TRIMESTRE	1.00	\$ 2,172,800.00	\$ -	\$ -	\$ 2,172,800.00
ACCIONES PROGRAMADAS TERCER TRIMESTRE	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACCIONES PROGRAMADAS CUARTO TRIMESTRE	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 2,172,800.00	\$ -	\$ -	\$ 2,172,800.00



RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-2026)



PERIODO TRIMESTRAL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026
MONTO AUT. FAISMUN. \$ 84,730,971.00
MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO) \$ 50,838,583.00

INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO POR OBRA (FAISMUN)






RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-2026)



PERIODO TRIMESTRAL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026
MONTO AUT. FAISMUN. \$ 84,730,971.00
MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO) \$ 50,838,583.00

INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO POR ACCION (INDIRECTOS)

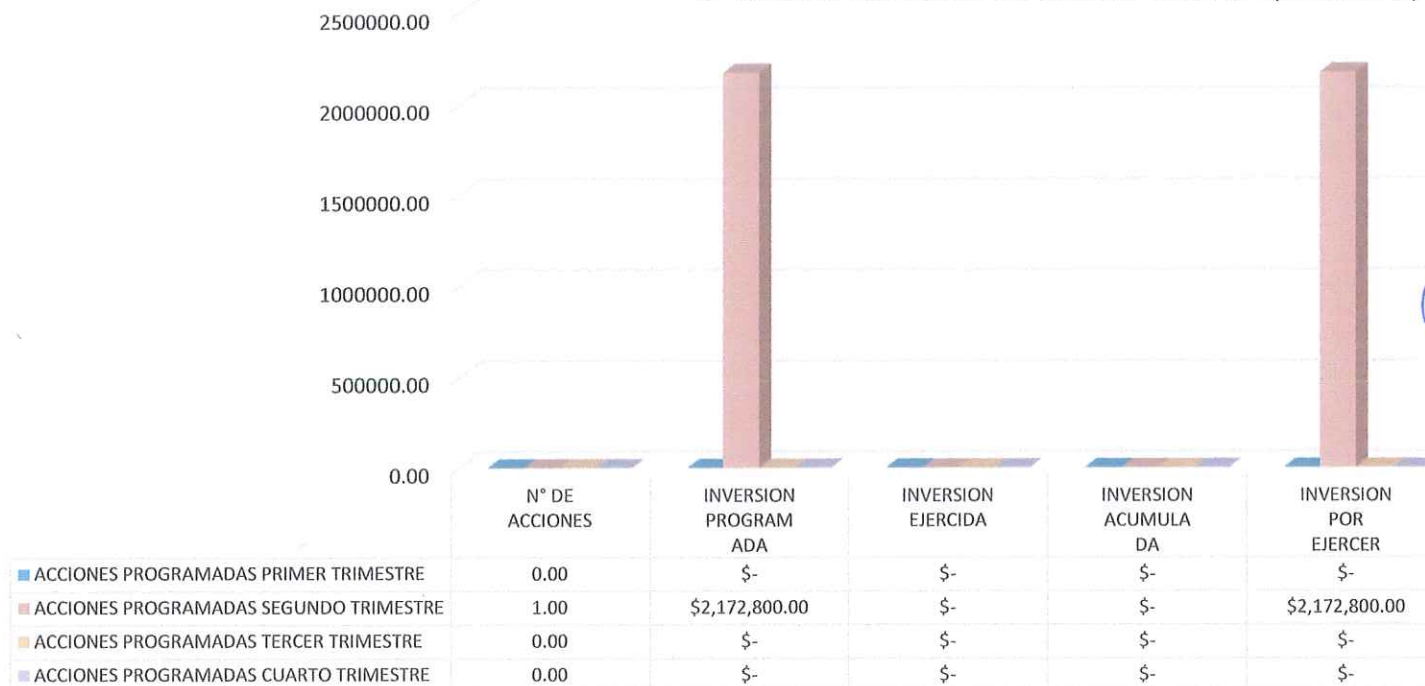

DIRECTORA DE PLANEACION, MODERNIZACION ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL

ING.- ARIADNA HERRERA RUEDA
(COORDINADORA GENERAL DEL COPLADEMUN)

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CALKINÍ, CAMPECHE
2024 - 2027
DIRECCION DE PLANEACION
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
E INNOVACION GUBERNAMENTAL
