



SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO (PAIP 2026)



RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-2026)

FECHA: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026

MONTO AUT. (FAISMUN). 2026: \$ 84,730,971.00
MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO): \$ 50,838,583.00

NUMERO	RUBRO	CLASIFICACION POR RUBRO	SIFAS	MODALIDAD	No. DE OBRA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	No. OFICIO DE APROBACION	FECHA DE APROBACION	MONTO APROBADO	PERIODO DE EJECUCION		INVERSION EN EL TRIMESTRE (PESOS)					AVANCE				% DE EJECUCION DE LOS REC. EN EL AÑO X TRIM.	ESTADO Y/O SITUACION DE LA OBRA	
												INICIO	TERMINO	MONTO CONTRATADO Y/O MODIFICADO	EJERCIDA (FAISMUN)	ACUMULADO (FAISMUN)	POR EJERCER (CONTRATADO - ACUMULADO)	SALDOS (CONTRATADO - ACUMULADO)	FISICO		FINANCERO				
												REAL	REAL						TRIM %	ACUM %	TRIM %	ACUM %			
PROGRAMA																									
1	IND	GASTOS DE INDIRECTOS	8354	ARRENDAMIENTO	AUT26MD1001001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SUPERVISION DE OBRA	VARIOS	IT	R33MAPR001001	12-may-26	\$ 2,172,800.00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA	
OBRA PUBLICA																									
0																									
1	URB	URBANIZACION	146702	CONSTRUCCION	AUT26M1001001	CONSTRUCCION DE CALLE CON BASE HIDRAULICA UNIENDO LA COL. FATIMA , COL. SAN ROMAN Y COL. LA SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE CALKINI	CALKINI	IT	R33MAPR001001	08-may-26	\$ 974,377.99	18-may-26	22-jun-26	\$ 972,332.35	\$ 972,323.74	\$ 972,323.74	\$ -	\$ 8.61	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	1.15%	TERMINADA	
2	URB	URBANIZACION	146727	CONSTRUCCION	AUT26M1001002	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD AGROPECUARIA TU CK PLANTEEN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO	SANTA CRUZ PUEBLO	IT	R33MAPR001002	11-may-26	\$ 1,318,086.63	27-may-26	10-jul-26	\$ 1,316,479.68	\$ 394,843.90	\$ 394,843.90	\$ 921,535.78	\$ -	85.00%	85.00%	30.00%	0.00%	0.47%	EN PROCESO	
3	URB	URBANIZACION	149816	CONSTRUCCION	AUT26M1001003	CONSTRUCCION DE CALLE CON BASE HIDRAULICA EN LA CALLE 20A ENTRE CALLE 33 Y 37, CALLE 37 ENTRE CALLE 20A Y 16 Y CALLE S/N ENTRE CALLE 16 Y 14 BARRIO LA SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE BECAL	BECAL	IT	R33MAPR001003	14-may-26	\$ 1,842,912.67	27-may-26	27-jul-26	\$ 1,839,853.74	\$ 1,839,848.29	\$ 1,839,848.29	\$ -	\$ 5.45	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	2.17%	TERMINADA	
4	URB	URBANIZACION	149804	CONSTRUCCION	AUT26M1001004	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD HORTICOLA SAN BARTOLO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE NUNKINI	SANTA FE, NUNKINI	IT	R33MAPR001004	14-may-26	\$ 413,437.61	01-jun-26	30-jun-26	\$ 412,839.59	\$ 412,839.59	\$ 412,839.59	\$ -	\$ -	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.49%	TERMINADA	
5	URB	URBANIZACION	150679	CONSTRUCCION	AUT26M1001005	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD AGRICOLA AGROPECUARIA PIÑUELA EN LA LOCALIDAD DE NINGUNO, NUNKINI	NINGUNO, NUNKINI	IT	R33MAPR001005	14-may-26	\$ 1,608,473.63	03-jun-26	17-jul-26	\$ 1,606,002.68	\$ 481,800.80	\$ 481,800.80	\$ 1,124,201.86	\$ -	30.00%	30.00%	30.00%	0.00%	0.57%	EN PROCESO	
6	URB	URBANIZACION	151544	CONSTRUCCION	AUT26M0001008	CONSTRUCCION DE CALLE CON BASE HIDRAULICA CALLE S/N ENTRE CARRETERA NUNKINI Y CALLE 26 BARRIO EL GATO NEGRO LOCALIDAD DE NUNKINI	NUNKINI	IT	R33MAPR001008	14-may-26	\$ 520,709.22	01-jun-26	30-jun-26	\$ 520,709.22	\$ 155,693.16	\$ 155,693.16	\$ 365,016.06	\$ -	70.00%	70.00%	29.90%	0.00%	0.18%	EN PROCESO	
7	MEV	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	153422	CONSTRUCCION	AUT26M1001007	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XCACOC	XCACOC	IT	R33MAPR001007	01-jun-26	\$ 700,572.41	12-jun-26	27-jun-26	\$ 699,463.44	\$ 209,839.03	\$ 209,839.03	\$ 489,624.41	\$ -	50.00%	50.00%	30.00%	0.00%	0.25%	EN PROCESO	
8	URB	URBANIZACION	157093	CONSTRUCCION	AUT26M1001008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AMPLIACION DIVINO NIÑO POR CALLE 13, LOCALIDAD CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI	CALKINI	IT	R33MAPR001008	03-jun-26	\$ 1,196,694.85	25-jun-26	24-jul-26	\$ 1,195,462.72	\$ -	\$ -	\$ 1,195,462.72	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	EN PROCESO	
9	URB	URBANIZACION	155788	REHABILITACION	AUT26M1001009	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 32 ENTRE 35, 37 Y TRIGESIMO SEPTIMA, EN LA LOCALIDAD DE BECAL, MUNICIPIO DE CALKINI	BECAL	IT	R33MAPR001009	03-jun-26	\$ 2,318,957.53			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA	
10	URB	URBANIZACION	157246	REHABILITACION	AUT26M1001010	REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 15 ENTRE 14 Y 18, CALLE 17 ENTRE 22 Y 18, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EXHACIENDA, MUNICIPIO DE CALKINI	SANTA CRUZ EXHACIENDA	IT	R33MAPR001010	03-jun-26	\$ 2,459,466.20			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA	
11	URB	URBANIZACION	160690	CONSTRUCCION	AUT26M1001011	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR, EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI	CALKINI	IT	R33MAPR001011	03-jun-26	\$ 2,996,604.68			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA	
12	URB	URBANIZACION	161084	CONSTRUCCION	AUT26M1001012	CONSTRUCCION DE LA CALLE PARALELA A FFCC POR CALLE 20, EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI	CALKINI	IT	R33MAPR001012	14-jun-26	\$ 1,659,359.11	26-jun-26	30-jul-26	\$ 1,659,359.11	\$ -	\$ -	\$ 1,659,359.11	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	EN PROCESO	
13	URB	URBANIZACION	155936	CONSTRUCCION	AUT26M1001013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SIN NUMERO POR CALLE 28, COLONIA CARLOS RIVAS, EN LA LOCALIDAD DE BECAL, MUNICIPIO DE CALKINI	BECAL	IT	R33MAPR001013	04-jun-26	\$ 1,416,309.93			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA	
14	URB	URBANIZACION	160918	CONSTRUCCION	AUT26M1001014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE POR TANQUE ELEVADO SAN ROMAN, EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI	CALKINI	IT	R33MAPR001014	05-jun-26	\$ 649,600.00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA	
15	ALC	ALCANTARILLADO	161004	CONSTRUCCION	AUT26M1001015	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE 32 ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, EN LA LOCALIDAD BECAL, MUNICIPIO DE CALKINI	BECAL	IT	R33MAPR001015	05-jun-26	\$ 275,350.48			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA	
16	URB	URNANIZACION	164666	CONSTRUCCION	AUT26M1001016	CONSTRUCCION DE CALLE CON BASE HIDRAULICA EN LA CALLE S/N POR CALLE 22 BARRIO KILAKAN EN LA LOCALIDAD DE CALKINI	CALKINI	IT	R33MAPR001016	08-jun-26	\$ 465,617.41	22-jun-26	21-jul-26	\$ 464,709.24	\$ -	\$ -	\$ 464,709.24	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	EN PROCESO	
17	URB	URBANIZACION	162748	CONSTRUCCION	AUT26M1001017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ENTRE CALLE 22C Y BARRIO SAN ROMAN, EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI	CALKINI	IT	R33MAPR001017	09-jun-26	\$ 1,250,313.67			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA	
18	MEV	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	165713	CONSTRUCCION	AUT26M1001018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN CHUNHUAS	SAN AGUSTIN CHUNHUAS	IT	R33MAPR001018	10-jun-26	\$ 700,572.41	22-jun-26	05-ago-26	\$ 697,230.06	\$ 209,175.92	\$ 209,175.92	\$ 488,077.14	\$ -	40.00%	40.00%	30.00%	0.00%	0.25%	EN PROCESO	



SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO (PAIP 2026)

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-2026)



FECHA: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026

MONTO AUT. (FAISMUN). 2026: \$ 84,730,971.00
MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO): \$ 50,838,583.00

NUMERO	RUBRO	CLASIFICACION POR RUBRO	SEIAS	MODALIDAD	No. DE OBRA	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	No. OFICIO DE APROBACION	FECHA DE APROBACION	MONTO APROBADO	PERIODO DE EJECUCION		INVERSION EN EL TRIMESTRE (PESOS)					AVANCE				% DE EJECUCION DE LOS REC. EN EL AÑO X TRIM.	ESTADO Y/O SITUACION DE LA OBRA
												INICIO	TERMINO	MONTO CONTRATADO Y/O MODIFICADO	EJERCIDA (FAISMUN)	ACUMULADO (FAISMUN)	POR EJERCER (CONTRATADO - ACUMULADO)	SALDOS (CONTRATADO - ACUMULADO)	FISICO		FINANCIERO			
												REAL	REAL						TRIM%	ACUM %	TRIM %	ACUM %		
19	URB	URBANIZACION	162025	CONSTRUCCION	AUT26M1001019	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD AGRICOLA SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI	NUNKINI	IT	R33MAPR001019	12-jun-26	\$ 986,052.00	23-jun-26	31-jul-26	\$ 985,405.43	\$ -	\$ -	\$ 985,405.43	\$ -	40.00%	40.00%	0.00%	0.00%	0.00%	EN PROCESO
20	MEV	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	157368	CONSTRUCCION	AUT26M1001020	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUCNACHEN	PUCNACHEN	IT	R33MAPR001020	12-jun-26	\$ 1,054,632.85	23-jun-26	21-ago-26	\$ 1,053,999.26	\$ 316,190.78	\$ 316,190.78	\$ 737,778.48	\$ -	10.00%	10.00%	30.00%	0.00%	0.37%	EN PROCESO
21	URB	URBANIZACION	163863	REHABILITACION	AUT26M1001021	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN , MUNICIPIO DE CALKINI	tepakani	IT	R33MAPR001021	12/06/2026	\$ 997,312.08			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA
22	URB	URBANIZACION	164977	REHABILITACION	AUT26M1001022	REHABILITACION DE LA TECHUMBRE DE GRADAS DE CAMPO DE BEISBOL , EN LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA , MUNICIPIO DE CALKINI	isla arena	IT	R33MAPR001022	16-jun-26	\$ 1,919,823.97			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA
23	URB	URBANIZACION	165755	CONSTRUCCION	AUT26M1001023	CONSTRUCCION DE CALLE CON BASE HIDRAULICA EN LA CALLE S/N ENTRE CALLE 22A Y CALLE 22B COLONIA DE FATIMA, ATRAS DEL CBTIS 126 EN LA LOCALIDAD DE CALKINI	calakini	IT	R33MAPR001023	16-jun-26	\$ 671,293.50			\$ 669,695.12	\$ -	\$ -	\$ 669,695.12	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	EN PROCESO
24	APO	AGUA POTABLE	163125	AMPLIACION	AUT26M1001024	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE S/N POR CALLE 28 EN LA COLONIA CARLOS RIVAS, EN LA LOCALIDAD DE BECAL, MUNICIPIO CALKINI	calakini	IT	R33MAPR001024	17-jun-26	\$ 776,997.00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA
25	MEV	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	167202	CONSTRUCCION	AUT26M1001025	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUNKINI	NUNKINI	IT	R33MAPR001025	17-jun-26	\$ 1,054,632.85	26-jun-26	24-ago-26	\$ 1,053,354.11	\$ -	\$ -	\$ 1,053,354.11	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	EN PROCESO
26	MEV	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	171213	construccion	AUT26M1001026	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CALKINI	calakini	IT	R33MAPR001026	23-jun-26	\$ 2,609,472.47			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA
27	URB	URBANIZACION	166741	construccion	AUT26M1001027	CONSTRUCCIÓN DE CALLE BASE HIDRÁULICA EN LA CALLE 12 ATRAS DEL CBTIS 126 EN LA LOCALIDAD DE CALKINI	calakini	IT	R33MAPR001027	24-jun-26	\$ 717,541.29			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA
28	URB	URBANIZACION	163063	construccion	AUT26M1001028	CONSTRUCCION DE CALLE BASE HIDRÁULICA EN LA CALLE 24 POR CALLE 21 Y CALLE S/N EN LA LOCALIDAD DE PUCNACHEN	pucnachen	IT	R33MAPR001028	24-jun-26	\$ 392,161.66			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA
29	URB	URBANIZACION	172809	rehabilitacion	AUT26M1001029	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO COLONIAL EN LA CALLE 20 ENTRE AV. EDUARDO BAEZA GARCIA Y CALLE 21 EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, EN EL MUNICIPIO DE CALKINI	calakini	IT	R33MAPR001029	25-jun-26	\$ 1,889,835.32			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA
30	URB	URBANIZACION	173208	rehabilitacion	AUT26M1001030	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO PRINCIPAL EN EL AREA DE JUEGOS INFANTILES EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI	calakini	IT	R33MAPR001030	25-jun-26	\$ 4,547,607.43			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA
31	APO	AGUA POTABLE	172847	AMPLIACION	AUT26M1001031	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE 31A ENTRE CALLE 22 Y CALLE 29, EN EL BARRIO DE KILAKAN , EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI	CALKINI	IT	R33MAPR001031	29-jun-26	\$ 758,509.87			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA
TOTALES														\$ 15,146,888.73	\$ 4,992,655.21	\$ 4,992,655.21	\$ 10,154,219.46	\$ 14.06						

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.D.E.E. MILTON UUSAS MILLAN ATOCHE
(PRESIDENTE DEL COPLADEMUN)

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO,
AGROPECUARIO, DE INVERSION Y
BIENES PUBLICOS

ING. FILIBERTO UUSAS TURRIZA
(ASESOR TECNICO DE DESARROLLO SOCIAL)

DIRECTORA DE PLANEACION, MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA E INNOVACION
GOBIERNAMUNICIPAL

ING. ARIADNA HERRERA RUEDA
(COORDINADORA GENERAL DEL COPLADEMUN)

DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL

ING. VIVIANA ELIZABETH RUZ SAENZ
(ASESORA TECNICA DE OBRAS PUBLICAS)

DIRECTOR DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

M.A.I. ANDRES JAVIER CANCHE KU



EL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CALAKMUL, CAMPECHE
2024 - 2027
DIRECCION DE PLANEACION
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
E INNOVACION GOBIERNAMUNICIPAL

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

ING. DIEGO FERNANDO FLORES CARON
(ASESOR TECNICO DE FINANZAS)

DIRECTOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. JESUS HAZARENO COLU CHI
(VOCA DE CONTROL Y VIGILANCIA)



RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-2026)



INDICADORES DE GESTION
01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026

MONTO AUT. FAISMUN. 2026: \$ 84,730,971.00
MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO) \$ 50,838,583.00

CONCEPTOS (RUBRO DE GASTO)	INVERSION PRESUPUESTADA	INVERSION MODIFICADA	INVERSION CONTRATADA	INVERSION EJERCIDA AL TRIMESTRE	INVERSION ACUMULADA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA AL TRIMESTRE
AGUA POTABLE	\$ 3,275,836.64	\$ 3,275,836.64				0.00%
ALCANTARILLADO	\$ 1,400,980.25	\$ 1,400,980.25				0.00%
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	\$ 4,171,886.21	\$ 4,171,886.21				0.00%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 18,283,307.00	\$ 18,283,307.00	\$ 3,504,039.87	\$ 735,205.73	\$ 735,205.73	0.87%
URBANIZACION	\$ 53,611,541.48	\$ 53,611,541.48	\$ 11,642,848.86	\$ 4,257,449.48	\$ 4,257,449.48	5.02%
PROGRAMA DE INDIRECTOS 3%	\$ 2,292,800.00	\$ 2,292,800.00				0.00%
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PRODIMDF 2%	\$ 1,694,619.42	\$ 1,694,619.42				0.00%
TOTALES	84,730,971.00	84,730,971.00	\$ 15,146,888.73	\$ 4,992,655.21	\$ 4,992,655.21	5.89%



RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-2026)




INDICADORES DE GESTION

01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026

MONTO AUT. FAISMUN. 2026: \$ 84,730,971.00
MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO) \$ 50,838,583.00

INDICADORES DE GESTION

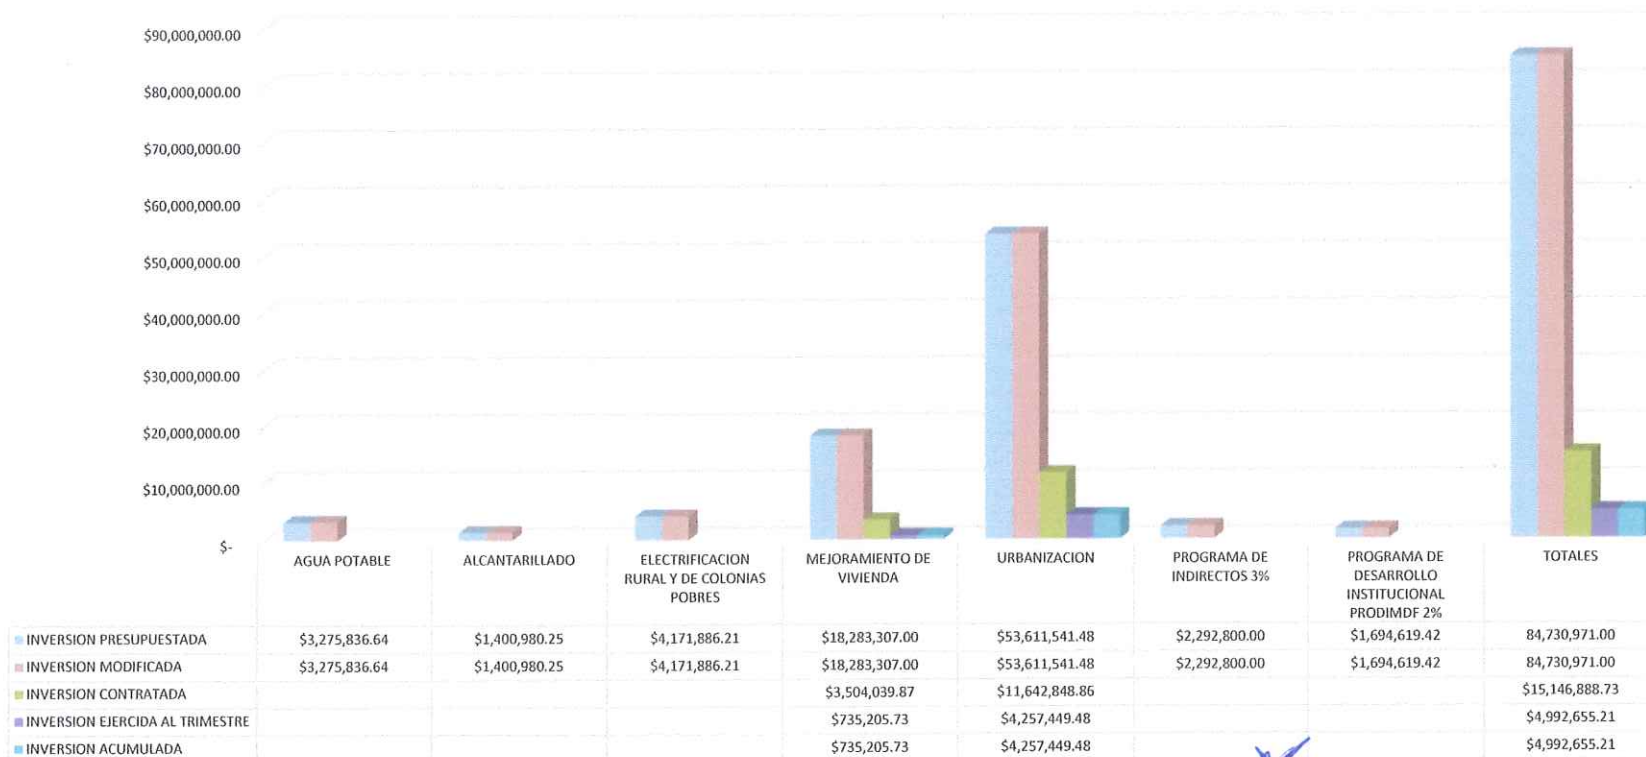

Segundo Avance Trimestral (Abril - Junio 2026)




RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-2026)



INDICADORES DE GESTION

01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026

MONTO AUT. FAISMUN. 2026: \$ 84,730,971.00
MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO) \$ 50,838,583.00

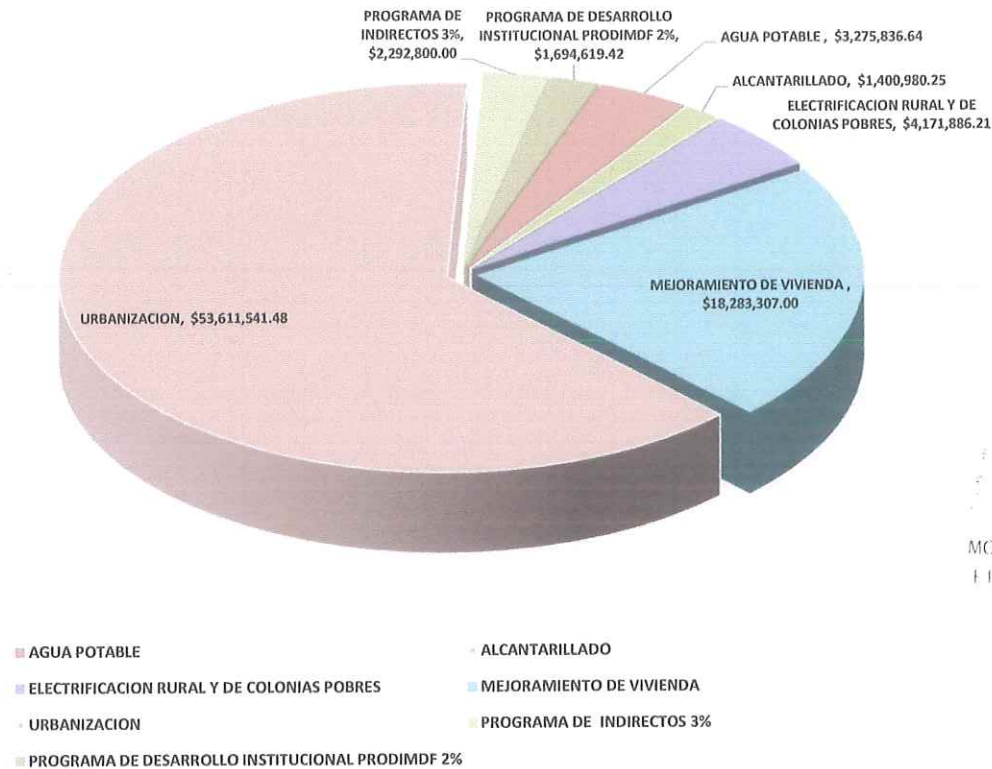

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CAL KINI, CAMPECHE
2024-2027
DIRECCION DE PLANEACION
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
E INNOVACION GUBERNAMENTAL

DIRECTORA DE PLANEACION, MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL

ING.- ARIADNA HERRERA RUEDA
(COORDINADORA GENERAL DEL COPLADEMUN)

Segundo Avance Trimestral (Abril - Junio 2026)



RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-2026)



PERIODO TRIMESTRAL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026

MONTO AUT. FAISMUN. 2026: \$ 84,730,971.00
MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO): \$ 50,838,583.00

INDICADOR DE DESEMPEÑO

			RECURSOS EJERCIDOS EN EL TRIMESTRE					
CONCEPTOS (RUBRO DE GASTO)		INVERSION MODIFICADA	(FAISMUN) 2026				Total	Porc.
			1 Ene-Mar	2 Abr-Jun	3 Jul-Sep	4 Oct-Dic		
SERVICIOS BASICOS	AGUA POTABLE.	\$ 3,275,836.64	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	0.00%
	ALCANTARILLADO	\$ 1,400,980.25	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	0.00%
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	\$ 4,171,886.21	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	0.00%
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$ 18,283,307.00	\$ -	\$ 735,205.73		\$ -	\$ 735,205.73	0.87%
	URBANIZACION	\$ 53,611,541.48	\$ -	\$ 4,257,449.48		\$ -	\$ 4,257,449.48	5.02%
INTEGRACION Y DESARROLLO	PROGRAMA DE GASTOS DE INDIRECTOS 3%	\$ 2,292,800.00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	0.00%
	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PRODIMDF 2%	\$ 1,694,619.42	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	0.00%
			\$ -					
TOTALES		\$ 84,730,971.00	\$ -	\$ 4,992,655.21	\$ -	\$ -	\$ 4,992,655.21	5.89%

DIRECTORA DE PLANEACION, MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL

ING.- ARIADNA HERRERA RUEDA
(COORDINADORA GENERAL DEL COPLADEMUN)

EL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CALAKMUL, CAMPECHE
2024 - 2027
DIRECCION DE PLANEACION
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
E INNOVACION GUBERNAMENTAL



RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-2026)



PERIODO TRIMESTRAL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026
MONTO AUT. FAISMUN. \$ 84,730,971.00
MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO) \$ 50,838,583.00

INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO POR OBRA (FAISMUN)

ESTADISTICA DE AVANCE DE OBRA	N° DE OBRAS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION ACUMULADA	INVERSION POR EJERCER
OBRAS PROGRAMADAS PRIMER TRIMESTRE	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OBRAS PROGRAMADAS SEGUNDO TRIMESTRE	31.00	\$ 41,140,298.88	\$ 4,992,655.21	\$ 4,992,655.21	\$ 36,147,643.67
OBRAS PROGRAMADAS TERCER TRIMESTRE	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OBRAS PROGRAMADAS CUARTO TRIMESTRE	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 41,140,298.88	\$ 4,992,655.21	\$ 4,992,655.21	\$ 36,147,643.67

INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO POR ACCION (INDIRECTOS)

ESTADISTICA DE AVANCE DE ACCIONES (IND)	N° DE ACCIONES	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION ACUMULADA	INVERSION POR EJERCER
ACCIONES PROGRAMADAS PRIMER TRIMESTRE	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACCIONES PROGRAMADAS SEGUNDO TRIMESTRE	1.00	\$ 2,172,800.00	\$ -	\$ -	\$ 2,172,800.00
ACCIONES PROGRAMADAS TERCER TRIMESTRE	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACCIONES PROGRAMADAS CUARTO TRIMESTRE	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 2,172,800.00	\$ -	\$ -	\$ 2,172,800.00




RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-2026)



PERIODO TRIMESTRAL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026
MONTA AUT. FAISMUN. \$ 84,730,971.00
MONTA MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO) \$ 50,838,583.00

INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO POR OBRA (FAISMUN)

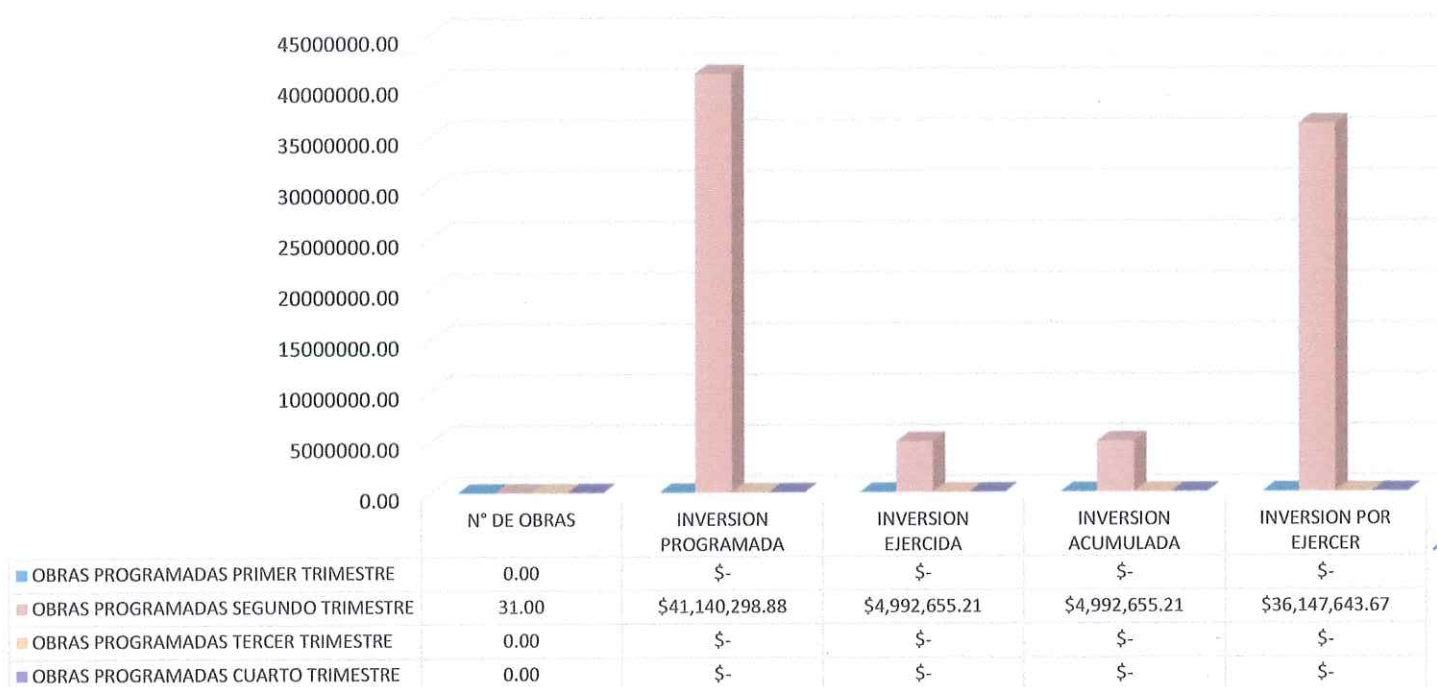



RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-2026)



PERIODO TRIMESTRAL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026
MONTO AUT. FAISMUN. \$ 84,730,971.00
MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO) \$ 50,838,583.00

INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO POR ACCION (INDIRECTOS)



DIRECTORA DE PLANEACION, MODERNIZACION ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL

ING.- ARIADNA HERRERA RUEDA
(COORDINADORA GENERAL DEL COPLADEMUN)

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CALKINI, CAMPECHE
2024 - 2027
DIRECCION DE PLANEACION
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
E INNOVACION GUBERNAMENTAL



SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO (PAIP 2026 Y PAAAS 2026)

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

(FORTAMUN)



FECHA: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026
MONTO APR. FORTAMUN 2026.- \$ 44,162,285.00
MONTO MINISTRADO FORTAMUN 2026.- \$22,081,140.00

PROGRAMA PREUPUESTAL	PARTIDA ESPECIFICA	CONCEPTO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	LOCALIDAD	NO. DE OFICIO DE APROBACION	FECHA DE APROBACION	PRESUPUESTO	INVERSION (PESOS)		INVERSION EJERCIDA EN EL TRIMESTRE			AVANCE				ESTADO Y/O SITUACION DE LA OBRA
								MODIFICADO	CONTRATADA Y/O MODIFICADA	PAGADO	ACUMULADO	POR EJERCER	FISICO TRIM %	FINANCIERO ACUM %	TRIM %	ACUM %	

SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES

CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES																	
SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES	154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	PAGO DE DESPENSAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	VARIAS			\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450,000.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA
CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS																	
SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES	211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MATERIAL DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	VARIAS			\$ -	\$ 258,687.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 258,687.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA
SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES	212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	TINTAS PARA IMPRESORAS DE LICENCIAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	VARIAS			\$ 95,000.00	\$ 95,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95,000.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA
SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES	216	MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	VARIAS			\$ 60,000.00	\$ 237,787.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 237,787.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA
SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES	218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	ADQUISICION DE TARJETAS PARA LICENCIAS DE CONducir Y LAMINADOR IDP HOLOGRAFICO, DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	VARIAS	R33FMUNAPR001009	23/08/2026	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA
SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES	221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	INSUMOS PARA LA ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	VARIAS			\$ 459,360.00	\$ 221,245.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 221,245.29	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA
SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES	261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GASOLINA Y DIESEL PARA LA PLANTILLA VEHICULAR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	VARIAS	R33FMUNAPR001001	02-mar-26	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 524,763.00	\$ 235,163.00	\$ 524,763.00	\$ 1,975,237.00	9.41%	20.99%	9.41%	20.99%	EN PROCESO
CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES																	
SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES	312	SERVICIO DE GAS	SERVICIO DE GAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	VARIAS			\$ 20,880.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA
SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES	355	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES	MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA VEHICULAR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIUDADANA	VARIAS			\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 928.00	\$ 928.00	\$ 928.00	\$ 399,072.00	0%	0%	0%	0%	EN PROCESO
SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES	358	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOZA SEPTICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	VARIAS			\$ 92,800.00	\$ 92,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92,800.00	0%	0%	0%	0%	NO INICIADA
SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES	375	VIATICOS EN EL PAIS	VIATICOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	VARIAS			\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	0%	0%	0%	0%	NO INICIADA



SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO (PAIP 2026 Y PAAAS 2026)

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FORTAMUN)



FECHA: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026
MONTO APR. FORTAMUN 2026.- \$ 44,162,285.00
MONTO MINISTRADO FORTAMUN 2026.- \$ 22,081,140.00

PROGRAMA PREUPUESTAL	PARTIDA ESPECIFICA	CONCEPTO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	LOCALIDAD	NO. DE OFICIO DE APROBACION	FECHA DE APROBACION	PRESUPUESTO	INVERSION (PESOS)		INVERSION EJERCIDA EN EL TRIMESTRE			AVANCE				ESTADO Y/O SITUACION DE DE LA OBRA
								MODIFICADO	CONTRATADA Y/O MODIFICADA	PAGADO	ACUMULADO	POR EJERCER	FISICO		FINANCIERO		
CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y HERRAMIENTAS																	
SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES	562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	ADQUISICION DE ESTUFA INDUSTRIAL PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	VARIAS			\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA
SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES	565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN PARA LA DIRECCION DE SGURIDAD PUBLICA	VARIAS			\$ 1,858,843.00	\$ 2,096,957.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,096,957.71	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA
CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA																	
SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES	622	EDIFICACION NO HABITACIONAL	CONSTRUCCION DE SALA AUDIOVISUAL EN LA COMANDANCIA DE LA POLICIA EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI.	CALKINI			\$ 2,250,000.00	\$ 1,761,885.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,761,885.29	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA
SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES	622	EDIFICACION NO HABITACIONAL	CONSTRUCCION DE FOZA SEPTICA DE LA COMANDANCIA DE LA POLICIA , EN LA LOCALIDAD DE CALKINI, MUNICIPIO DE CALKINI	CALKINI			\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA
SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES	624	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	CALKINI			\$ 415,574.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INIADA
SUBTOTAL							\$ 8,832,457.00	\$ 8,594,342.29	\$ 525,691.00	\$ 236,091.00	\$ 525,691.00	\$ 8,068,651.29					

SATISFACCION PARA SUS REQUERIMIENTOS

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES															
SATISFACCION PARA SUS REQUERIMIENTOS	311	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	CALKINI	R33FMUNAPR001004	02-mar-26	\$ 5,833,706.97	\$ 5,833,706.97	\$ 5,833,706.97	\$ -	\$ 5,833,706.97	\$ -	0.00%	100.00%	EN PROCESO
SUBTOTAL							\$ 5,833,706.97	\$ 5,833,706.97	\$ 5,833,706.97	\$ -	\$ 5,833,706.97	\$ -			

MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS															
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIRECCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI	CALKINI	R33FMUNAPR001008-A	05-jun-26	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 159,399.59	\$ 159,399.59	\$ 159,399.59	\$ 140,600.41	53.13%	53.13%	EN PROCESO
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	216	MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIRECCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI	CALKINI			\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	0.00%	0.00%	NO INICIADA
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	ADQUISICION DE LUMINARIAS Y MATERIAL ELECTRICO	VARIAS			\$ -	\$ 79,472.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	NO INICIADA
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	248	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	MATERIAL PARA LA DIRECCION DE AGUA POTABLE	VARIAS			\$ -	\$ 99,828.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 99,828.00	0.00%	0.00%	NO INICIADA



SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO (PAIP 2026 Y PAAAS 2026)

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

(FORTAMUN)



FECHA: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026
MONTO APR. FORTAMUN 2026.- \$ 44,162,285.00
MONTO MINISTRADO FORTAMUN 2026.- \$22,081,140.00

PROGRAMA PREUPUESTAL	PARTIDA ESPECIFICA	CONCEPTO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	LOCALIDAD	NO. DE OFICIO DE APROBACION	FECHA DE APROBACION	PRESUPUESTO	INVERSION (PESOS)		INVERSION EJERCIDA EN EL TRIMESTRE			AVANCE				ESTADO Y/O SITUACION DE LA OBRA
								MODIFICADO	CONTRATADA Y/O MODIFICADA	PAGADO	ACUMULADO	POR EJERCER	FISICO		FINANCIERO		
													TRIM %	ACUM %	TRIM %	ACUM %	
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	MATERIALES PARA LA DIRECCION DE AGUA POTABLE	VARIAS			\$ 99,828.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA
SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES	261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GASOLINA Y DIESEL PARA LA PLANTILLA VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE CALKINI	CALKINI	R33FMUNAPR001005	02-mar-26	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 272,709.39	\$ 272,709.39	\$ 272,709.39	\$ 727,290.61	27.27%	27.27%	27.27%	27.27%	EN PROCESO
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES																	
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	311	ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	CALKINI	R33FMUNAPR001004	02-mar-26	\$ 25,966,293.03	\$ 25,886,821.03	\$ 7,192,465.00	\$ 7,192,465.00	\$ 7,192,465.00	\$ 18,694,356.03	27.78%	27.78%	27.78%	27.78%	EN PROCESO
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	314	TELEFONIA TRADICIONAL	SERVICIOS DE TELEFONOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI	CALKINI	R33FMUNAPR001003 - A	01-jun-26	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 66,830.46	\$ 66,830.46	\$ 66,830.46	\$ 33,169.54	66.83%	66.83%	66.83%	66.83%	EN PROCESO
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	317	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	SERVICIO DE INTERNET DE H AYUNTAMIENTO DE CALKINI	CALKINI	R33FMUNAPR001003 (MODIFICADO)	01-jun-26	\$ 200,000.00	\$ 100,000.00	\$ 31,068.00	\$ 31,068.00	\$ 31,068.00	\$ 68,932.00	31.07%	31.07%	31.07%	31.07%	EN PROCESO
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DIRECCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI	CALKINI	R33FMUNAPR001007	02-mar-26	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00	\$ 118,025.25	\$ 118,025.25	\$ 118,025.25	\$ 361,974.75	24.59%	24.59%	24.59%	24.59%	EN PROCESO
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONES	EVALUACION DE LOS FONDOS FEDERALES ESPECIFICAS DE DESEMPEÑO DE LOS RECURSOS FEDERALES FAISMUN 2025, FORTAMUN 2025,Y FOPET 2025	CALKINI	R33FMUNAPR001008	05-jun-26	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,000.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NO INICIADA
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	355	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS	MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI	CALKINI	R33FMUNAPR00102	02-mar-26	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ 226,218.24	\$ 213,967.48	\$ 213,967.48	\$ 86,032.52	71.32%	71.32%	71.32%	71.32%	EN PROCESO
SUBTOTAL							\$ 28,996,121.03	\$ 28,996,121.03	\$ 8,066,715.93	\$ 8,054,465.17	\$ 8,054,465.17	\$ 20,941,655.86					

DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS

CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES																
DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS	392	IMPUESTOS Y DERECHOS	EXPLOTACION USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES USO DE AGUA POTABLE	CALKINI	R33FMUNAPR001006	02/03/2026	\$ 114,991.00	\$ 114,991.00	\$ 114,991.00	\$ 114,991.00	\$ -	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	TERMINADA
SUBTOTAL							\$ 114,991.00	\$ 114,991.00	\$ 114,991.00	\$ -	\$ 114,991.00	\$ -				



SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO (PAIP 2026 Y PAAAS 2026)

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FORTAMUN)



FECHA: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026
MONTO APR. FORTAMUN 2026.- \$ 44,162,285.00
MONTO MINISTRADO FORTAMUN 2026.- \$22,081,140.00

PROGRAMA PREPUUESTAL	PARTIDA ESPECIFICA	CONCEPTO	DESCRIPCION DE LOS BIENES	LOCALIDAD	NO. DE OFICIO DE APROBACION	FECHA DE APROBACION	PRESUPUESTO	INVERSION (PESOS)		INVERSION EJERCIDA EN EL TRIMESTRE			AVANCE		ESTADO Y/O SITUACION DE DE LA OBRA		
								MODIFICADO	CONTRATADA Y/O MODIFICADA	PAGADO	ACUMULADO	POR EJERCER	FISICO			FINANCIERO	
													TRIM %	ACUM %		TRIM %	ACUM %

FINANZAS PUBLICAS SANAS

CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES															
FINANZAS PUBLICAS SANAS	392	IMPUESTOS Y DERECHOS	EXPLOTACION USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES USO DE AGUA POTABLE	CALKINI	R33FMUNAPR001006	02/03/2026	\$ 385,009.00	\$ 385,009.00	\$ 118,991.00	\$ 118,991.00	\$ 118,991.00	\$ 266,018.00	30.91%	30.91%	EN PROCESO
SUBTOTAL							\$ 385,009.00	\$ 385,009.00	\$ 118,991.00	\$ 118,991.00	\$ 118,991.00	\$ 266,018.00			
TOTAL							\$ 44,162,285.00	\$ 43,924,170.29	\$ 14,660,095.90	\$ 8,409,547.17	\$ 14,647,845.14	\$ 29,276,325.15			

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.D.E.E. MILTON OLISIS MILLÁN ATOCHE
(PRESIDENTE DEL COPLADEMUN)

DIRECTORA DE PLANEACION, MODERNIZACION ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL

ING. ARIADNA HERREIRA RUEDA
(COORDINADORA GENERAL DEL COPLADEMUN)

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

ING. DIEGO FERNANDO FLORES CAHUN
(ASESOR TECNICO DE FINANZAS)

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO, DE INCLUSION Y BIENESTAR SOCIAL

ING. FILIBERTO JESUS RU TURRIZA
(ASESOR TECNICO DE DESARROLLO SOCIAL)

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL

ING. VIVIANA ELIDEROZ SÁENZ
(ASESORA TECNICA DE OBRAS PUBLICAS)

DIRECTOR DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

M.A.I. ANDRES JAVIER CANCHE KU

DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. JESUS NAZARENO COLLI CHI
(VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA)





RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FORTAMUN)



INDICADORES DE GESTION


01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026

MONTO AUT. FORTAMUN. 2026: \$ 44,162,285.00

MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE
(ACUMULADO) \$22,081,140.00

RUBRO	PRESUPUESTO	INVERSION MODIFICADA	INVERSION CONTRATADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION ACUMULADA
SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES	\$ 8,832,457.00	\$ 8,594,342.29	\$ 525,691.00	\$ 236,091.00	\$ 525,691.00
SATISFACCION PARA SUS REQUERIMIENTOS	\$ 5,833,706.97	\$ 5,833,706.97	\$ 5,833,706.97	\$ -	\$ 5,833,706.97
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	\$ 28,996,121.03	\$ 28,996,121.03	\$ 8,066,715.93	\$ 8,054,465.17	\$ 8,054,465.17
DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS	\$ 114,991.00	\$ 114,991.00	\$ 114,991.00	\$ -	\$ 114,991.00
FINANZAS PUBLICAS SANAS	\$ 385,009.00	\$ 385,009.00	\$ 118,991.00	\$ 118,991.00	\$ 118,991.00
	\$ 44,162,285.00	\$ 43,924,170.29	\$ 14,660,095.90	\$ 8,409,547.17	\$ 14,647,845.14

INDICADORES DE GESTION

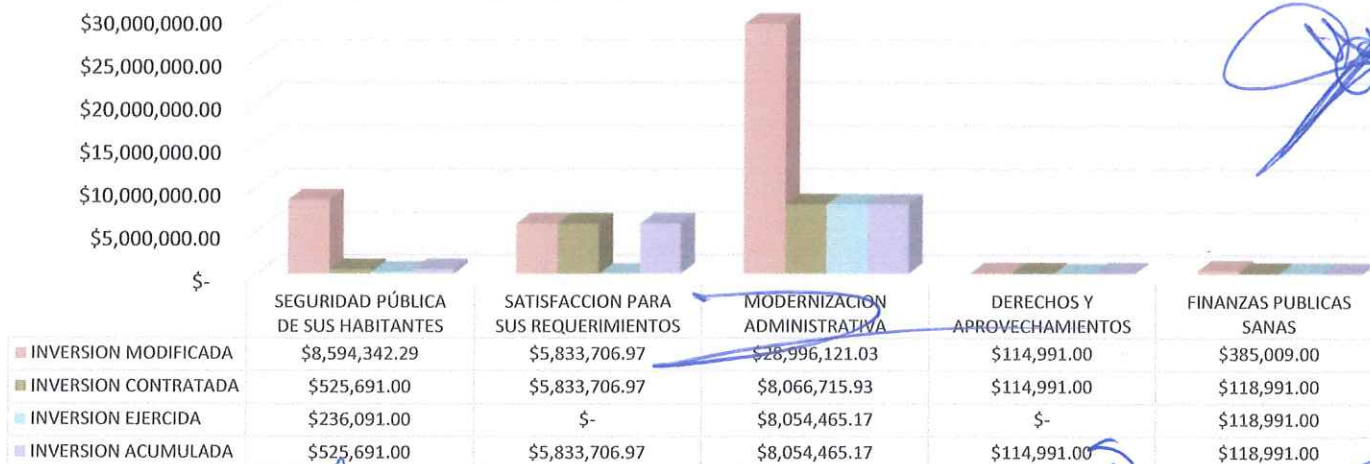



RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FORTAMUN)




INDICADORES DE GESTION

01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026

MONTO AUT. FORTAMUN. 2026:
MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE
(ACUMULADO)

\$ 44,162,285.00

\$22,081,140.00

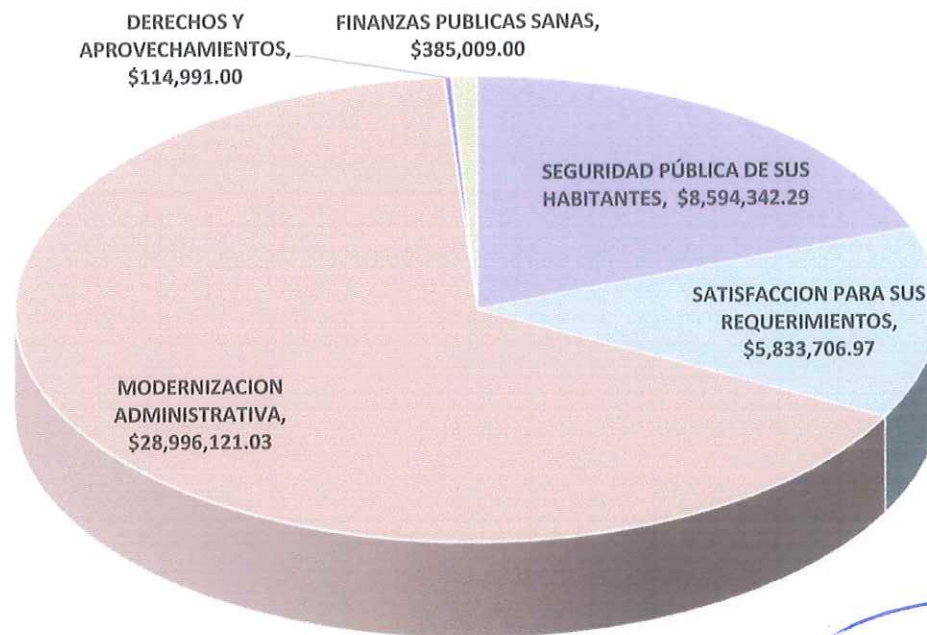

- SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES
- SATISFACCION PARA SUS REQUERIMIENTOS
- MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
- DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS
- FINANZAS PUBLICAS SANAS

II. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CALKINÍ, CAMPECHE
2024 - 2027
DIRECCION DE PLANEACION
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
E INNOVACION GUBERNAMENTAL

DIRECTORA DE PLANEACION, MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL

ING. ARIADNA HERRERA RUEDA



**RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)**



PERIODO TRIMESTRAL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026
INVERSION APROBADA: \$ 41,324,051.00
MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE
(ACUMULADO). \$22,081,140.00

INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO POR ACCION (FORTAMUN)

ESTADISTICA DE AVANCE DE ACCIONES	Nº DE ACCIONES	INVERSION PROGRAMADA AL TRIMESTRE	INVERSION EJERCIDA	INVERSION ACUMULADA	INVERSION POR EJERCER
ACCIONES PROGRAMADAS PRIMER TRIMESTRE	8.00	\$ 11,040,570.00	\$ 6,238,297.97	\$ 6,238,297.97	\$ 4,802,272.03
ACCIONES PROGRAMADAS SEGUNDO TRIMESTRE	21.00	\$ 22,081,140.00	\$ 8,409,547.17	\$ 14,647,845.14	\$ 7,433,294.86
ACCIONES PROGRAMADAS TERCER TRIMESTRE					
ACCIONES PROGRAMADAS CUARTO TRIMESTRE					
TOTAL	21.00	\$ 22,081,140.00	\$ 8,409,547.17	\$ 14,647,845.14	\$ 7,433,294.86



**RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)**



PERIODO TRIMESTRAL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026
INVERSION APROBADA: \$ 41,324,051.00
**MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE
(ACUMULADO):** \$22,081,140.00

INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO POR ACCION (FORTAMUN)



**DIRECTORA DE PLANEACION, MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL**

**ING.- ARIADNA HERRERA RUEDA
(COORDINADORA GENERAL DEL COPLADEMUN)**

**II. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CALKINÍ, CAMPECHE
2024 - 2027
DIRECCION DE PLANEACION
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
E INNOVACION GUBERNAMENTAL**



SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL ABRIL - JUNIO (PAIP 2026 Y PAAAS 2026)

RAMO 23.- FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FEFMPH 2026)



FECHA: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026

MONTO AUT. (FEFMPH 2026): \$ 4,919,093.00
MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO): \$ 2,045,823.94

NUMERO	CLASIFICACION POR RUBRO	MODALIDAD	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	No. OFICIO DE APROBACION	FECHA DE APROBACION	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	PERIODO DE EJECUCION		INVERSION EN EL TRIMESTRE (PESOS)				AVANCE				ESTADO Y/O SITUACION DE LA OBRA
										INICIO	TERMINO					FISICO		FINANCIERO		
										REAL	REAL	CONTRATADA Y/O MODIFICADA	PAGADO	ACUMULADO	POR EJERCER (CONTRATADO ACUMULADO)	TRIM%	ACUM %	TRIM %	ACUM %	
OBRA PUBLICA																				
1	URBANIZACION	REHABILITACION	REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA, MUNICIPIO DE CALKINI	ISLA ARENA	IT	R23MAPR001004	18-jun-26	\$ 1,599,999.99	\$ 1,599,999.99						\$ -					
SUBTOTAL								\$ 1,599,999.99	\$ 1,599,999.99			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					

NUMERO	CLASIFICACION POR RUBRO	MODALIDAD	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	No. OFICIO DE APROBACION	FECHA DE APROBACION	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	PERIODO DE EJECUCION		INVERSION EN EL TRIMESTRE (PESOS)				AVANCE				ESTADO Y/O SITUACION DE LA OBRA
										INICIO	TERMINO					FISICO		FINANCIERO		
										REAL	REAL	CONTRATADA Y/O MODIFICADA	PAGADO	ACUMULADO	POR EJERCER (CONTRATADO ACUMULADO)	TRIM%	ACUM %	TRIM %	ACUM %	
ADQUISICIONES																				
1	URBANIZACION	ADQUISICION	ADQUISICION DE EMULSION RR	CALKINI	IT	R23MAPR001002	17/06/2026	\$ 396,200.00	\$ 396,200.00											
2	URBANIZACION	ADQUISICION	ADQUISICION DE MATERIAL ASFALTO EN FRIO 3/8	CALKINI	IT	R23MAPR001001	17/06/2026	\$ 195,917.15	\$ 195,917.15											
SUBTOTAL								\$ 592,117.15	\$ 592,117.15			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					
							TOTAL	\$ 2,192,117.14	\$ 2,192,117.14			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.D.E.E. MILTON ULISES MILLÁN ATOCHE
(PRESIDENTE DEL COPLADEMUN)

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO,
AGROPECUARIO, DE INCLUSIÓN Y
BIENESTAR SOCIAL

ING. FILIBERTO JESUS KÚ TURRIZA
(ASESOR TECNICO DE DESARROLLO SOCIAL)

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL

ING. VIVIANA ELIDIE RUIZ SÁENZ
(ASESORA TÉCNICA DE OBRAS PUBLICAS)

DIRECTORA DE PLANEACION, MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL

ING. ARIADNA HERRERA RUEDA
(COORDINADORA GENERAL DEL COPLADEMUN)



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CALKINI, CAMPECHE
2024 - 2027
DIRECCION DE PLANEACION
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
E INNOVACION GUBERNAMENTAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

M.A.I. ANDRES JAVIER CANCHE KU

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

M.A. DIEGO FERNANDO FLORES CAHON
(ASESOR TECNICO DE FINANZAS)

DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. JESUS NAZARENO COLI CHI
(VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA)



RAMO 23.- FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FEFMPH 2026)



INDICADORES DE GESTION

01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026

MONTO AUT. FEFMPH 2026: \$ 4,919,093.00
MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE
(ACUMULADO) \$ 2,045,823.94

CONCEPTOS	INVERSION MODIFICADA	INVERSION CONTRATADA	INVERSION EJERCIDA AL TRIMESTRE	INVERSION ACUMULADA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA
URBANIZACION (OBRA PUBLICA)	\$ 3,326,975.85				
URBANIZACION (ADQUISICIONES)	\$ 1,592,117.15				
TOTALES	4,919,093.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%

INDICADORES DE GESTION






RAMO 23.- FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FEFMPH 2026)




INDICADORES DE GESTION

01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026

MONTO AUT. FEFMPH 2026:	\$	4,919,093.00
MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO)	\$	2,045,823.94

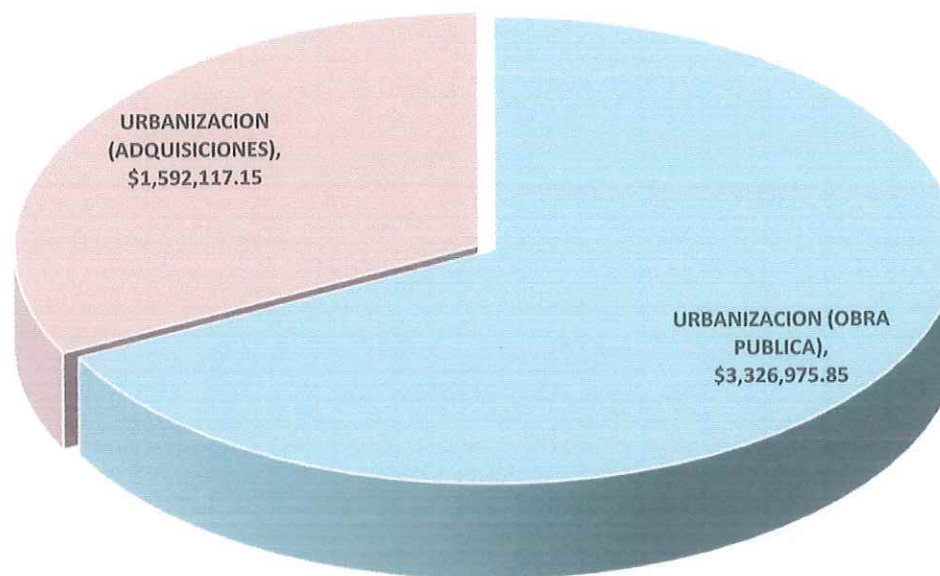



EL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CALKINÍ, CAMPECHE
2024 - 2027
DIRECCION DE PLANEACION
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
E INNOVACION GUBERNAMENTAL

DIRECTORA DE PLANEACION, MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL


ING. ARIADNA HERRERA RUEDA
(COORDINADORA GENERAL DEL COPLADEMUN)



RAMO 23.- FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FEFMPH 2026)



PERIODO TRIMESTRAL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026

MONTO AUT. FEFMPH 2026: \$ 4,919,093.00
MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO): \$ 2,045,823.94

INDICADOR DE DESEMPEÑO

		RECURSOS EJERCIDOS EN EL TRIMESTRE					
PROGRAMA	INVERSION MODIFICADA	(FEFMPH) 2026				Total	Porc.
		1 Ene-Mar	2 Abr-Jun	3 Jul-Sep	4 Oct-Dic		
URBANIZACION (OBRA PUBLICA)	\$ 3,326,975.85	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	0.00%
URBANIZACION (ADQUISICIONES)	\$ 1,592,117.15					\$ -	0.00%
TOTALES	\$ 4,919,093.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%

DIRECTORA DE PLANEACION, MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA E INNOVACION
GUBERNAMENTAL

ING.- ARIADNA HERRERA RUEDA
(COORDINADORA GENERAL DEL COPLADEMUN)

EL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CALAKIM, CAMPECHE
2024 2027
DIRECCION DE PLANEACION
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
E INNOVACION GUBERNAMENTAL



RAMO 23.- FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FEFMPH 2026)




PERIODO TRIMESTRAL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026
MONTO AUT. FEFMPH 2026 \$ 4,919,093.00
MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE
(ACUMULADO) \$ 2,045,823.94

INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO POR OBRA (FEFMPH 2026)

ESTADISTICA DE AVANCE DE OBRA	Nº DE OBRAS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION ACUMULADA	INVERSION POR EJERCER
OBRAS PROGRAMADAS PRIMER TRIMESTRE	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OBRAS PROGRAMADAS SEGUNDO TRIMESTRE	3.00	\$ 2,192,117.14	\$ -	\$ -	\$ 2,192,117.14
OBRAS PROGRAMADAS TERCER TRIMESTRE	0.00				
OBRAS PROGRAMADAS CUARTO TRIMESTRE	0.00				
		\$ 2,192,117.14	\$ -	\$ -	\$ 2,192,117.14

INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO POR OBRA FEFMPH 2026

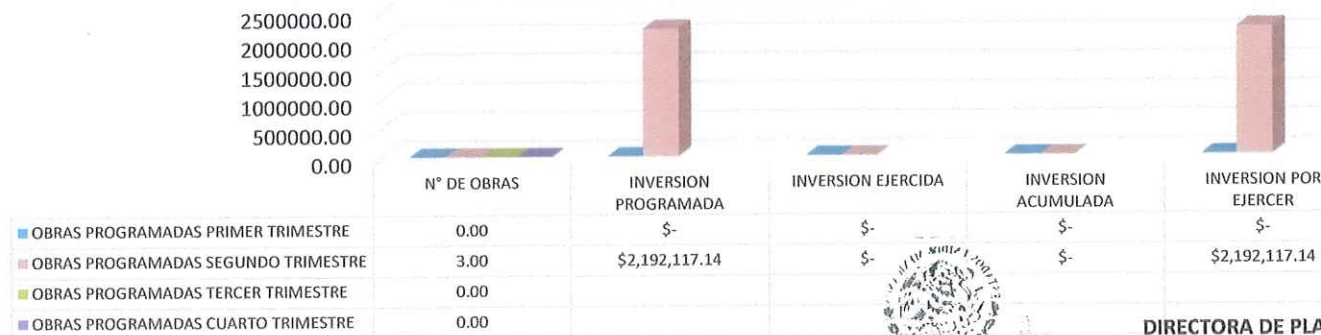

EL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CALAKMUL, CAMPECHE
2024 - 2027
DIRECCION DE PLANEACION
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
E INNOVACION GUBERNAMENTAL

DIRECTORA DE PLANEACION, MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL

ING. ARIADNA HERRERA RUEDA
(COORDINADORA GENERAL DEL COPLADEMUN)



SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL ABRIL - JUNIO (PAIP 2026 Y PAAAS 2026)

RAMO 23.- FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FEFMPH 2025)



FECHA: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026

MONTO AUT. (FEFMPH 2025): \$ 354,874.91

MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO): \$ 354,874.91

NUMERO	CLASIFICACION POR RUBRO	MODALIDAD	DESCRIPCION DEL PROYECTO	LOCALIDAD	SITUACION DE LA OBRA	No. OFICIO DE APROBACION	FECHA DE APROBACION	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	PERIODO DE EJECUCION		INVERSION EN EL TRIMESTRE (PESOS)				AVANCE				ESTADO Y/O SITUACION DE LA OBRA
										INICIO	TERMINO					FISICO		FINANCIERO		
										REAL	REAL	CONTRATADA Y/O MODIFICADA	PAGADO	ACUMULADO	POR EJERCER (CONTRATADO- ACUMULADO)	TRIM%	ACUM %	TRIM %	ACUM %	
OBRA PUBLICA																				
1	URBANIZACION	REHABILITACION	REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA, MUNICIPIO DE CALKINI	ISLA ARENA	IT	R23MAPRO01003	18-jun-26	\$ 354,874.91	\$ 354,874.91						\$ -			0.00%	0.00%	
SUBTOTAL								\$ 354,874.91	\$ 354,874.91			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -					

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.D.E.E. MILTON ULISAS MILLÁN ATOCHE
(PRESIDENTE DEL COPLADEMUN)

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO, AGROPECUARIO, DE INMIGRACION Y BIENESTAR SOCIAL


ING. FILIBERTO GUESUS KÚ TURRIZA
(ASESOR TECNICO DE DESARROLLO SOCIAL)

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL

ING. VIVIANA ELI DE RUZ SÁENZ
(ASESORA TECNICA DE OBRAS PUBLICAS)

DIRECTORA DE PLANEACION, MODERNIZACION ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL

ING.- ARIADNA HERREERA RUEDA
(COORDINADORA GENERAL DEL COPLADEMUN)



DIRECTOR DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

M.A.I. ANDRES JAVIER CANCHE KU

DIRECTOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL

M.A. DIEGO FERNANDO FLORES CAHUN
(ASESOR TECNICO DE FINANZAS)

DIRECTOR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. JESUS NAZARENO COLI CHI
(VOCAI DE CONTROL Y VIGILANCIA)



RAMO 23.- FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FEFMPH 2025)




INDICADORES DE GESTION

01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026

MONTO AUT. FEFMPH 2025: \$ 354,874.91
MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE
(ACUMULADO) \$ 354,874.91

CONCEPTOS	INVERSION MODIFICADA	INVERSION CONTRATADA	INVERSION EJERCIDA AL TRIMESTRE	INVERSION ACUMULADA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA
URBANIZACION (OBRA PUBLICA)	\$ 354,874.91	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
TOTALES	354,874.91	-	-	-	0.00%

URBANIZACION (OBRA PUBLICA)

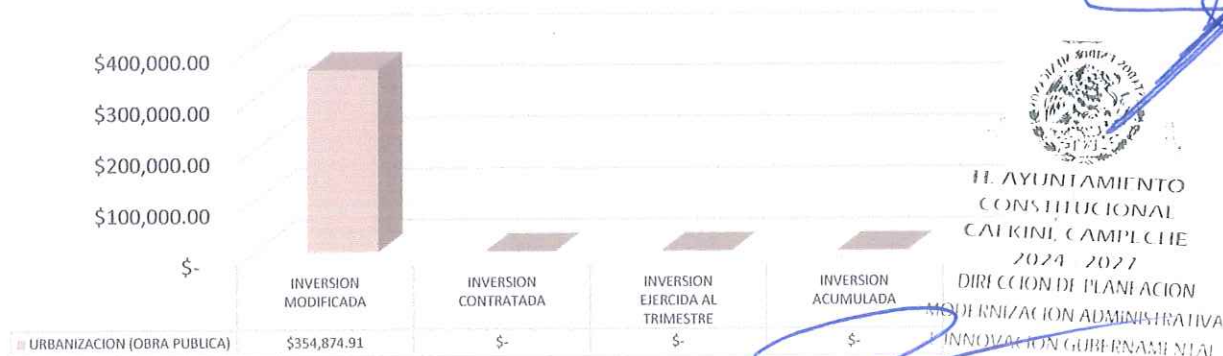

DIRECTORA DE PLANEACION, MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA E INNOVACION GUBERNAMENTAL

ING.- ARIADNA HERRERA RUEDA
(COORDINADORA GENERAL DEL COPLADEMUN)



RAMO 23.- FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FEFMPH 2025)



PERIODO TRIMESTRAL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026

MONTO AUT. FEFMPH 2025: \$ 354,874.91
MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE (ACUMULADO): \$ 354,874.91

INDICADOR DE DESEMPEÑO

		RECURSOS EJERCIDOS EN EL TRIMESTRE					
PROGRAMA	INVERSION MODIFICADA	(FEFMPH) 2025				Total	Porc.
		1 Ene-Mar	2 Abr-Jun	3 Jul-Sep	4 Oct-Dic		
URBANIZACION (OBRA PUBLICA)	\$ 354,874.91	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	0.00%
TOTALES	\$ 354,874.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%

DIRECTORA DE PLANEACION, MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA E INNOVACION
GUBERNAMENTAL

ING.- ARIADNA HERRERA RUEDA
(COORDINADORA GENERAL DEL COPLADEMUN)


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CALKINI, CAMPECHE
2024 - 2027
DIRECCION DE PLANEACION
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
E INNOVACION GUBERNAMENTAL



**RAMO 23.- FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS
(FEFMPH 2025)**



PERIODO TRIMESTRAL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026
MONTO AUT. FEFMPH 2025 \$ 354,874.91
MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE
(ACUMULADO) \$ 354,874.91

INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO POR OBRA (FEFMPH 2025)

ESTADISTICA DE AVANCE DE OBRA	N° DE OBRAS	INVERSION PROGRAMADA	INVERSION EJERCIDA	INVERSION ACUMULADA	INVERSION POR EJERCER
OBRAS PROGRAMADAS PRIMER TRIMESTRE	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OBRAS PROGRAMADAS SEGUNDO TRIMESTRE	1.00	\$ 354,874.91	\$ -	\$ -	\$ 354,874.91
OBRAS PROGRAMADAS TERCER TRIMESTRE	0.00				
OBRAS PROGRAMADAS CUARTO TRIMESTRE	0.00				
		\$ 354,874.91	\$ -	\$ -	\$ 354,874.91



**RAMO 23.- FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS
(FEFMPH 2025)**



PERIODO TRIMESTRAL: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026
MONTO AUT. FEFMPH 2025 \$ 354,874.91
**MONTO MINISTRADO AL TRIMESTRE
(ACUMULADO)** \$ 354,874.91

INDICADORES DE GESTION Y DESEMPEÑO POR OBRA FEFMPH 2025

**H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CALKINI, CAMPECHE
2024 - 2027
DIRECCION DE PLANEACION
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
E INNOVACION GUBERNAMENTAL**



**DIRECTORA DE PLANEACION, MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA E INNOVACION
GUBERNAMENTAL**

**ING.- ARIADNA HERRERA RUEDA
(COORDINADORA GENERAL DEL COPLADEMUN)**
